



T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ (KABEV PROJESİ)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI

Kasım 2022

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	6
1.GENEL PROJE VE PROJE SAHASI BİLGİSİ	7
1.1. Projenin Tanımı	7
Genel Bilgi & Hedef.....	7
1.1.1. Proje Bilgileri.....	8
1.1.2. Binanın Konumu.....	13
2.YASAL ÇERÇEVE VE DÜNYA BANKASI OPERASYONEL POLİTİKALARI İLE UYUMLULUK	15
2.1.Ulusal Mevzuat	15
2.2. Dünya Bankası Koruma Önlem Politikaları	18
OP 4.01. Çevresel Değerlendirme	18
3.ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI KONTROL LİSTESİ.....	18
4. ÇEVRESEL VE SOSYAL TARAMA	22
5. PAYDAŞ KATILIMI VE ŞİKÂYET ÇÖZÜM MEKANİZMALARI.....	26
6. ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSKLER & ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER ...	29
7. ÇEVRESEL VE SOSYAL İZLEME PLANI	46
8. GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	49
9. RAPORLAMA	50
10. EKLER	51
EK 1 - SAHA FOTOĞRAFLARI.....	51
EK 2 – ŞİKÂYET VE ÖNERİ FORMU	53
EK 3 - ŞİKAYET KAPATMA FORMU	58
EK 4 – ULUSAL MEVZUAT VE DB YÖNERGELERİ.....	59
1- Ulusal Mevzuat	59
1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG):	60
1.2. Toplum Sağlığı ve Güvenliği (TSG):	61
1.3. GES gereği Fotovoltaik Panel Kurulumu:.....	61
2- Dünya Bankası Grubu Çevre, Sağlık ve Güvenlik (DB ÇSG) Yönergeleri.....	62
a) OP 4.11. Fiziksel Kültürel Kaynaklar (FKK).....	62
b) OP 4.04. Doğal Habitatlar	62
c) OP 4.12. İstemsiz Yeniden Yerleşim	63
3- COVID-19 Rehberleri	64
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) REHBERLERİ	64
DÜNYA BANKASI GRUBU REHBERLERİ	65
ILO REHBERLERİ.....	65
MFI REHBERLERİ.....	65
EK 5– ASBEST BULUNAN BİNALARDA İZLENECEK PROSEDÜR	66

SÖKÜM İŞİNE BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR VE YASAL ZORUNLULUKLAR.....	66
SÖKÜM İŞİNE BAŞLAMADAN ÖNCE SAHADA YAPILACAK HAZIRLIKLAR ...	66
A – Söküm Bölgesinin Hazırlanması.....	66
B – Kullanılacak Malzeme ve Kişisel Koruyucu Donanımlar.....	66
EK 6– ENERJİ KİMLİK BELGESİ	68
Soru ve Cevaplar	81

TABLolar

Tablo 1 Proje Sahası Bilgileri	8
Tablo 2 Binada Yapılması Planlanan İmalatlar	9
Tablo 3 Öneri ve Bina Listesi	12
Tablo 4 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Kontrol Listesi	18
Tablo 5 Dünya Bankası Operasyonel Politikalar Çevresel ve Sosyal Tarama.....	23
Tablo 6 Proje Kapsamında Çevresel – Sosyal Etkisi Beklenmeyen Durumlar	24
Tablo 7 Çevresel ve Sosyal Riskler & Etkileri ve Alınacak Önlemler	29
Tablo 8 Çevresel ve Sosyal İzleme Planı	46
Tablo 9 Görev ve Sorumluluklar	49
Tablo 10 Raporlama Sürecinin Gereklilikleri ve Rol Dağılımı.....	50
Tablo 11 Katılımcı Listesi & İletişim Bilgileri	69
Tablo 12 Toplantı Ajandası	72
Tablo 13 Soru & Cevap Listesi	81
Tablo 14 Toplantı Notları & Genel Değerlendirme	82
Tablo 15 Toplantı Resimleri.....	83

ŞEKİLLER

Şekil 1 Pamukkale İlçesi Coğrafi Konumu	13
Şekil 2 Pamukkale Üniversitesi Uydu Görüntüsü-1	14
Şekil 3 Pamukkale Üniversitesi Uydu Görüntüsü-2.....	14
Şekil 4 Pamukkale Üniversitesi Uydu Görüntüsü-3.....	15
Şekil 5 Mevcut Enerji Kimlik Belgesi_Onkoloji Hastanesi.....	68

FOTOĞRAFLAR

Fotoğraf 1 Teknopark Genel Görselleri_Örnek Bina	51
Fotoğraf 2 Ömer Halisdemir Spor Salonu Genel Görselleri_Örnek Bina 2.....	51
Fotoğraf 3 Çatı Görselleri.....	51
Fotoğraf 4 Isıtma Merkezi Kazan Görselleri.....	51
Fotoğraf 5 Ömer Halisdemir Spor Salonu Kazan Görselleri	52

KISALTMALAR	
AB	Avrupa Birliği
ADB	Asian Development Bank
BP	Banka Prosedürü
CİMER	Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
ÇD	Çevresel Değerlendirme
ÇED	Çevresel Etki Değerlendirme
Ç&S	Çevresel ve Sosyal
ÇSÇ	Çevresel ve Sosyal Çerçeve
ÇSG	Çevre, Sağlık ve Güvenlik
ÇSYÇ	Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi
ÇSYP	Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı
ÇŞİDB	Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
DB	Dünya Bankası
dBA	Gürültü Azaltılması ve Kontrolü
dBC	Gürültü Değerlendirme Ölçüsü
ÇSS	Çevresel ve Sosyal Standartlar
DSÖ	Dünya Sağlık Örgütü
EAH	Eğitim ve Araştırma Hastanesi
EPS	Enerji Performans Sözleşmesi
ETKB	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
EVÖ	Enerji Verimliliği Önlemleri
FCU	Fan Coil Ünitesi
FFP3	Özel Partikül Maskesi
FKK	Fiziksel, Kültürel Kaynaklar
FY	Finansal Yönetim
GES	Güneş Enerji Santrali
GRS	DB Şikâyet Çözüm Servisi
HVAC	Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme Sistemleri
IGHC	Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazı
IFC	Uluslararası Finans Kurumu
İ&D	İzleme ve Değerlendirme
IDB	Inter American Development Bank
ILO	Uluslararası Çalışma Örgütü
İSG	İşçi Sağlığı ve Güvenliği
İSM	İl Sağlık Müdürlüğü
KABEV	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği
KfW DEG	Yatırımlardan Kaynaklı Risklerin Paylaşılması ve Uzun Vadeli Yatırım Sermayesinin Kullanılabilirliği Organizasyonu
KKD	Kişisel Koruyucu Donanımlar
KS/AHU	Klima Santralleri
LC Max	dBC olarak ölçülen, ölçüm süresi içerisinde C ağırlıklı rms tabanlı ses seviyesinin en büyük değeri
MEB	Milli Eğitim Bakanlığı

NACE	AVR. Birliği'nde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması Kodu
nZEB	Neredeyse Sıfır Enerjili Bina
OP	Operasyonel Politika
Proje	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi
PUB	Proje Uygulama Birimi
PV	Fotovoltaik Panel
OP	Operasyonel Politika
S&G	Sağlık & Güvenlik
SB	Sağlık Bakanlığı
SGK	Sosyal Güvenlik Kurumu
SSS	Sık Sorulan Sorular
ŞÇM	Şikâyet Çözüm Mekanizması
TC	Türkiye Cumhuriyeti
TEM	Avrupa Transit Otoyolu /Trans European Motorway
TEP	Ton Eşdeğer Petrol
TSG	Toplantı Sağlığı ve Güvenliği
YE	Yenilenebilir Enerji
YİGM	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

GİRİŞ

Bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) özelinde Kınıklı Mah. Üniversite Cad. No:11 20160 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan **Pamukkale Üniversitesi**'nde yapılacak yenileme faaliyetlerinin neden olabileceği çevresel ve sosyal etkilerin kabul edilebilir düzeyde tutulabilmesi ve/veya ortadan kaldırılabilmesi için alınması gereken önlemlerin ortaya konulması için hazırlanmıştır.

ÇSYP; proje uygulama aşamalarında alınacak önlemlerin kim tarafından, ne zaman, ne sıklıkla ve ne şekilde uygulanacağını açık bir şekilde ortaya koymak hedefindedir.

Bu ÇSYP, öncelikle Türkiye kanun ve yönetmeliklerine, bunlara ek olarak da Dünya Bankası politika ve tedbirlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

1.GENEL PROJE VE PROJE SAHASI BİLGİSİ

1.1. Projenin Tanımı

Genel Bilgi & Hedef

Ülkemizin enerji ihtiyacı, gelişen ekonomiye bağlı olarak şehirleşme ve nüfus artışının da etkisi ile her geçen gün artmaktadır. Artan ihtiyacın paydaşlarına bakıldığında ülkemizde binalar enerji tüketiminde sanayiden sonra ikinci sırada gelmektedir. KABEV Projesi'nin genel hedefi; kamunun sektöre öncülük ederek enerji tüketimini ve kamu kaynaklı cari açığın azaltılmasını sağlamak, diğer yandan enerji verimliliği çalışmaları için sektöre örnek olmasıdır.

KABEV Projesi'nin faydası enerji tüketiminin azaltılması ile kamu bütçesinde tasarruf sağlamanın yanısıra yaratacağı çevresel ve sosyal olumlu etkileri, toplumun bilinçlendirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Basit inşaat çalışmaları ile gerçekleştirilen faaliyetlerin, doğaları gereği mevcut proje sınırları içerisinde, çok kritik olmayan çevresel ve sosyal etkiler yaratacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla, Dünya Bankası Operasyonel Politikaları (OP)/Banka Prosedürleri (BP) gereklilikleri kapsamında, KABEV Projesi, muhtemel geçici, beklenen ve kısıtlı etkileri göz önünde bulundurularak B Kategorisi projeler kapsamında değerlendirilmektedir. Etkiler kritik olarak değerlendirilmese de Dünya Bankasının (DB) Çevresel Değerlendirme Politikası'nın (OP 4.01) uygulanması gerekmektedir. OP 4.01'in uygulamaya konulmasında önemli olan Çevre ve Sosyal (Ç&S) yönetim araçlarının yanı sıra İş Sağlığı Güvenliği (İSG) uygulamaları önem kazanmaktadır.

Bu ÇSYP, atık oluşumu (tehlikeli, tehlikesiz) gibi çevresel etkileri, yenileme aktivitelerinin kurumun günlük faaliyetleri ile çakışması gibi sosyal etkileri, işçi ve faydalanıcıların sağlık ve güvenliği gibi İSG etkilerini, DB ve ulusal ilgili mevzuat ile mevcut en iyi teknikler doğrultusunda mümkünse ortadan kaldırmak, değilse göz ardı edilebilecek seviyeye indirmek için KABEV Projesi için kılavuz doküman olarak hazırlanmıştır.

Proje, DB'nin fonlaması ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından yürütülecektir. Projenin genel uygulamasına ait asli kontrol, yönetim ve koordinasyonundan YİGM sorumlu olacaktır. İdarenin şartnamesinin ve ihale dokümanlarının ayrılmaz bir parçası olan bu ÇSYP'ye uygun imalatların yapılmasından yüklenici firma ve tüm Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin bu ÇSYP'ye uygunluğunun denetiminden ise Müşavir firma (Proje Müdürü) sorumlu olacaktır.

1.1.1. Proje Bilgileri

Tablo 1 Proje Sahası Bilgileri

GENEL BİLGİLER ¹	
Bina Adı	Pamukkale Üniversitesi
İl	Denizli
İlçe	Pamukkale
Adres	Kınıklı Mah. Üniversite Cad. No:11 20160 Pamukkale / Denizli
Kullanım Durumu	Bina hali hazırda üniversite olarak kullanılmaktadır.
Binayı Kullanan Kurum	Pamukkale Üniversitesi
Kullanıcı Sayısı	Misafir: 7.683 birey/gün Personel/Öğrenci Sayısı: 17.867 birey/gün
PROJE YAPI BİLGİLERİ	
Bina Sayısı	18 (nZEB olmayacak bina sayısı)
İnşaat Alanı	236.296 m ²
BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR	
Pamukkale Üniversitesi'nde Tablo 2' de özetlenen enerji verimliliği imalatlarının uygulaması sonrasında, binadaki enerji ihtiyacı azalacak binanın yıllık toplam enerji tüketiminde 15.723.098 kWh/yıl (%26,48)'lik tasarruf sağlanacaktır. Bu uygulamalar sonucunda yıllık 6.276,78 ton emisyon (CO ₂) azaltması sağlanacaktır. Ayrıca bu uygulamalar ile üniversitede konfor şartları da iyileşecektir. (Tablo 3'te bina bazında hangi önlemlerin uygulanacağı gösterilmiştir.)	
FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU	
Sene sonunda ihale dokümanlarının hazırlanması ile binanın yer teslim tarihine müteakip 8 (sekiz) ay içinde yüklenicinin imalatlarını bitirmesi planlanmaktadır. Yer teslim süresinin belirsizliği sebebiyle net bir sezon belirtilememekte olup 2023 senesinde iş bitişi sağlanacaktır.	
RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN İŞÇİ SAYISI	
Öngörülen işçi sayısı günlük 80 olup, imalat süresince değişiklik gösterebilecektir.	

¹ Pamukkale Üniversitesi KABEV Projesi kapsamındaki tüm binaların bilgisidir.

Tablo 2 Binada Yapılması Planlanan İmalatlar ²

NO	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖNLEMİ (EEM)	ENERJİ KAYNAĞI	TAHMİNİ YILLIK ENERJİ TASARRUFU (kWh)	TAHMİNİ YILLIK BİRİNCİL ENERJİ TASARRUFU (kWh)	TAHMİNİ YILLIK ENERJİ TASARRUFU (TEP)	TASARRUFUN TABAN ENERJİ TÜKETİMİNE ORANI %	TAHMİNİ YILLIK MALİYET TASARRUFU (₺)	EMİSYON AZALTMASI (ton CO ₂)
K01	Misafirhane çatı ısı yalıtımı (8 cm çatı yalıtımı)	ELEKTRİK	11.988	21.890	1,03	0,02%	33.566	7,36
		DOĞALGAZ	79.958	79.958	6,88	0,13%	48.926	16,15
K02	Çamaşırhane binası dış cephe yalıtımı (5 cm cephe yalıtımı)	ELEKTRİK	1.401	2.558	0,12	0,00%	3.923	0,86
		DOĞALGAZ	13.776	13.776	1,18	0,02%	17.893	2,51
K03	Eğitim Fakültesi Binası Çatı Isı Yalıtımı, Cam ve Doğrama Değişimi,	ELEKTRİK	38.860	70.958	3,34	0,07%	108.808	23,86
		DOĞALGAZ	93.244	93.244	8,02	0,16%	121.111	16,98
K04	Mühendislik A Blok Binası Çatı Isı Yalıtımı, Cam ve Doğrama Değişimi,	ELEKTRİK	59.417	108.495	5,11	0,10%	166.368	36,48
		DOĞALGAZ	107.691	107.691	9,26	0,18%	139.876	19,62
K05	Gün Işığı Tüpü Doğal Aydınlatma, Eğitim ve Mühendislik A Blok Binaları Üst Kat Koridorlarında Gün Işığı Tüpü Doğal Aydınlatma Uygulaması (16 Adet)	ELEKTRİK	2.628	4.799	0,23	0,00%	7.358	1,61
K06	Havuzun Sürekli 27-28 C ısıtılması için Yoğuşmalı Kazanı İlavesi (5x100 kW)	DOĞALGAZ	295.561	295.561	25,42	0,50%	180.857	53,83
K07	Eğitim Fakültesi Binası VRV ³ Uygulaması	ELEKTRİK	14.578	26.619	- 1,25	-0,02%	40.818	-8,95
		DOĞALGAZ	458.422	458.422	39,42	0,77%	595.431	83,50
K08	Mühendislik A Blok Binası Mekanik Tesisatın Yenilenmesi ve Isı Pompası Uygulaması	ELEKTRİK	121.194	221.300	- 10,42	-0,20%	339.343	-74,41
		DOĞALGAZ	1.033.034	1.033.034	88,84	1,74%	1.341.774	188,16

² Sarı ile işaretlenen önlemler, nZEB olmayacak binalar için uygulanacak önlemlerdir.³ Variable Refrigerant Volume (Değişken Soğutucu Hacmi)

NO	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖNLEMİ (EEM)	ENERJİ KAYNAĞI	TAHMİNİ YILLIK ENERJİ TASARRUFU (kWh)	TAHMİNİ YILLIK BİRİNCİL ENERJİ TASARRUFU (kWh)	TAHMİNİ YILLIK ENERJİ TASARRUFU (TEP)	TASARRUFUN TABAN ENERJİ TÜKETİMİNE ORANI %	TAHMİNİ YILLIK MALİYET TASARRUFU (₺)	EMİSYON AZALTIM A (ton CO ₂)
K09	Hastane (4 Adet Medikal Hava) Kompresörlerin Değişken Devirli Model İle Değişimi	ELEKTRİK	25.516	46.592	2,19	0,04%	80.886	15,67
K10	Eğitim ve Mühendislik A Blok Binalarına Havalandırma Cihazları ilavesi (130 adet)	ELEKTRİK	119.860	218.864	10,31	0,20%	335.608	73,59
		DOĞALGAZ	1.066.265	1.066.265	91,70	1,80%	1.384.929	194,21
K11	Eğitim ve Mühendislik A Blok Binaları Genel Alanlarda Havalandırma ve Eğitim Fakültesi Solarwall Uygulaması	ELEKTRİK	44.775	81.759	3,85	0,08%	125.370	27,49
		DOĞALGAZ	557.786	557.786	47,97	0,94%	724.487	101,60
K12	Isı merkezi 9 Adet Sirkülasyon Pompası ve Kollektör Değişimi	ELEKTRİK	115.695	211.259	9,95	0,19%	323.946	71,04
K13	Isı Merkezi 2 Adet 12.000.000 kCal/h, 1 Adet 6.000.000 kCal/h, Misafirhane 1 Adet 450.000 kCal/h Kazan Değişimi ve Güneş sıcak su kollektörleri ile desteklenmesi	ELEKTRİK	1.287	2.350	0,11	0,00%	3.604	0,79
		DOĞALGAZ	1.778.403	1.778.403	152,94	3,00%	2.292.999	323,92
K14	FCU Sirkülasyon Pompaları için Frekans Konvertörü Uygulaması (21 Cihaz)	ELEKTRİK	32.549	59.434	2,80	0,05%	91.133	19,99
K15	Isı dağıtım galerisinde ve ısıtma teknik hacimlerdeki yalıtımsız boru ve vanaların ısı yalıtımı	ELEKTRİK	15.102	27.576	1,30	0,03%	14.096	9,27
		DOĞALGAZ	48.446	48.446	4,17	0,08%	68.396	8,82
K16	Tesise ait 21 adet hava soğutmalı chillerin, frekans kontrollü hava soğutmalı chiller ile değişimi	ELEKTRİK	1.640.802	2.996.104	141,11	2,76%	4.871.860	1.007,45
K17	Klima santralleri mevcut EFF2 ve IE2 sınıf motorlarının IE3 verimli motor ile değişimi (230 adet motor değişimi)	ELEKTRİK	183.481	335.036	15,78	0,31%	558.180	112,66

NO	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖNLEMİ (EEM)	ENERJİ KAYNAĞI	TAHMİNİ YILLIK ENERJİ TASARRUFU (kWh)	TAHMİNİ YILLIK BİRİNCİL ENERJİ TASARRUFU (kWh)	TAHMİNİ YILLIK ENERJİ TASARRUFU (TEP)	TASARRUFUN TABAN ENERJİ TÜKETİMİNE ORANI %	TAHMİNİ YILLIK MALİYET TASARRUFU (₺)	EMİSYON AZALTIM A (ton CO ₂)
K18	Mevcut armatürlerin LED Armatür (17.175 adet) ile değişimi	ELEKTRİK	2.100.960	3.836.353	180,68	3,54%	6.244.084	1.289,99
K19	Havalandırma fan motorlarına frekans konvertörü ilavesi (47 adet)	ELEKTRİK	153.739	280.727	13,22	0,26%	430.470	94,40
K20	PV Elektrik Üretimi. Kampüs 3 adet bina çatı üstü ve 4 adet açık otopark sahası çelik konstrüksiyon üzerine fotovoltaik paneller ile enerji tesisinin kurulması (3.281 PV panel, 1.772 kWp, yıllık 2.524.730 kWh elektrik üretimi)	ELEKTRİK	2.524.730	4.610.157	217,13	4,25%	7.069.244	1.550,18
K21	Kapsamdaki binalarda klima santralleri ve sirkülasyon pompalarının otomasyona bağlanması ve bütün bu sistemlerin bir merkezden izlenebilmesi ve enerji izleme sistemi oluşturulması	ELEKTRİK	588.557	1.074.705	50,62	0,99%	1.647.960	361,37
		DOĞALGAZ	2.664.942	2.664.942	229,19	4,49%	3.461.388	485,40
TOPLAM		ELEKTRİK	7.525.575	13.741.700	647,20	12,67%	21.736.303	4.620,70
		DOĞALGAZ	8.197.523	8.197.523	704,99	13,81%	10.378.061	1.656,08

Tablo 3 Öneri ve Bina Listesi ⁴


		YALITIM	YALITIM	YALITIM N ZEB	YALITIM N ZEB	GÜN IŞIĞI TÜPÜ N ZEB	EK KAZAN	VRV	ISI POMPASI	KOMPRESÖR	HAVALANDIR MA N ZEB	SOLAR WALL N ZEB	POMPA VE KOLLEKTÖR	KAZAN	INV	TES. YALITIM	CHILLER	MOTOR	LED	MOTOR INV	PV	OTOMASYON
		K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07	K08	K09	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21
1	Teknopark																					
2	Ömer Halis demir Spor Salonu						K06								K14			K17	K18	K19	K20	K21
3	Kapalı Spor Salonu														K14			K17	K18			K21
4	Spor Bilimleri Fakültesi														K14				K18			K21
5	Teknoloji Fakültesi																K16	K17	K18			K21
6	Müzik ve Sahne Sanatları																K16	K17	K18	K19	K20	K21
7	Sağlık Meslek Yüksekokulu																K16	K17	K18		K20	K21
8	Eğitim Fakültesi*			K03		K05		K07			K10	K11							K18		K20	K21
9	Misafirhane	K01												K13								K21
10	Mühendislik A Blok**				K04	K05			K08		K10	K11							K18		K20	K21
11	Merkezi Yemekhane																K16	K17	K18	K19		K21
12	Rektörlük Binası														K14		K16	K17	K18		K20	K21
13	400 Yataklı Hastane									K09							K16	K17	K18			K21
14	Hastane Geçiş Bloğu																	K17	K18			K21
15	Onkoloji Hastanesi																K16	K17	K18			K21
16	Tıp Fakültesi																K16	K17	K18	K20		K21
17	Psikiyatri Hastanesi																K16	K17	K18			K21
18	Çamaşırhane Binası		K02																K18			K21
19	Isı merkezi												K12	K13		K15			K18			K21
20	Gama Knife Binası																					K21

⁴ 8 (Eğitim Fakültesi) ve 10 (Mühendislik A Blok) numaralı binalar proje kapsamında nZEB olarak değerlendirilecektir.


1.1.2. Binanın Konumu

Pamukkale Üniversitesi, Denizli iline bağlı Pamukkale ilçesinde bulunmaktadır. Denizli/Pamukkale, Anadolu Yarımadası'nın güneybatı, Ege Bölgesi'nin doğusunda yer almaktadır.

İlçenin güneyinde Tavas, batısında Buldan, Sarayköy, Merkezefendi; doğusunda ise Çal ve Honoz ilçeleri bulunmaktadır. Üniversite ise ilçenin güneyinde kalmaktadır. Önemli ulaşım yollarından E87 karayolunun batısındadır. Pamukkale Üniversitesi'nin yakın çevresinde (500 m yarıçap) ormanlık alan bulunmakla beraber eğitim ve konut yerleşkeleri yer almaktadır.

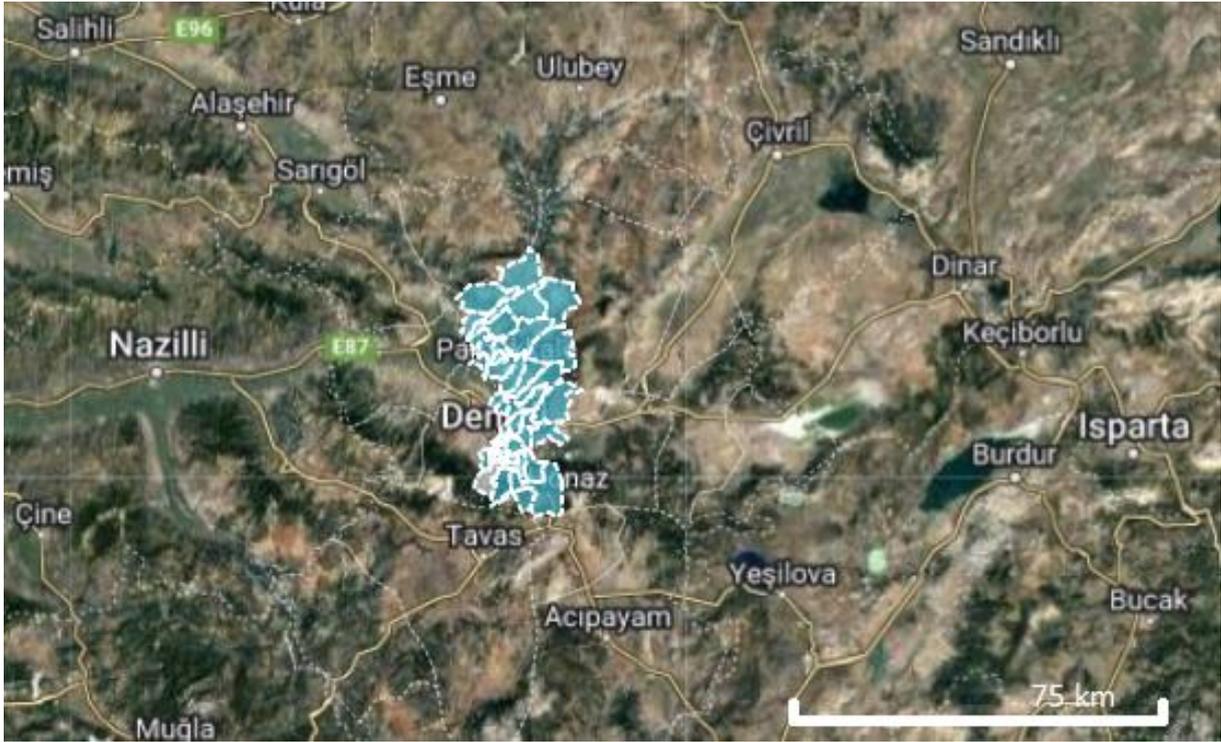


Şekil 1 Pamukkale İlçesi Coğrafi Konumu

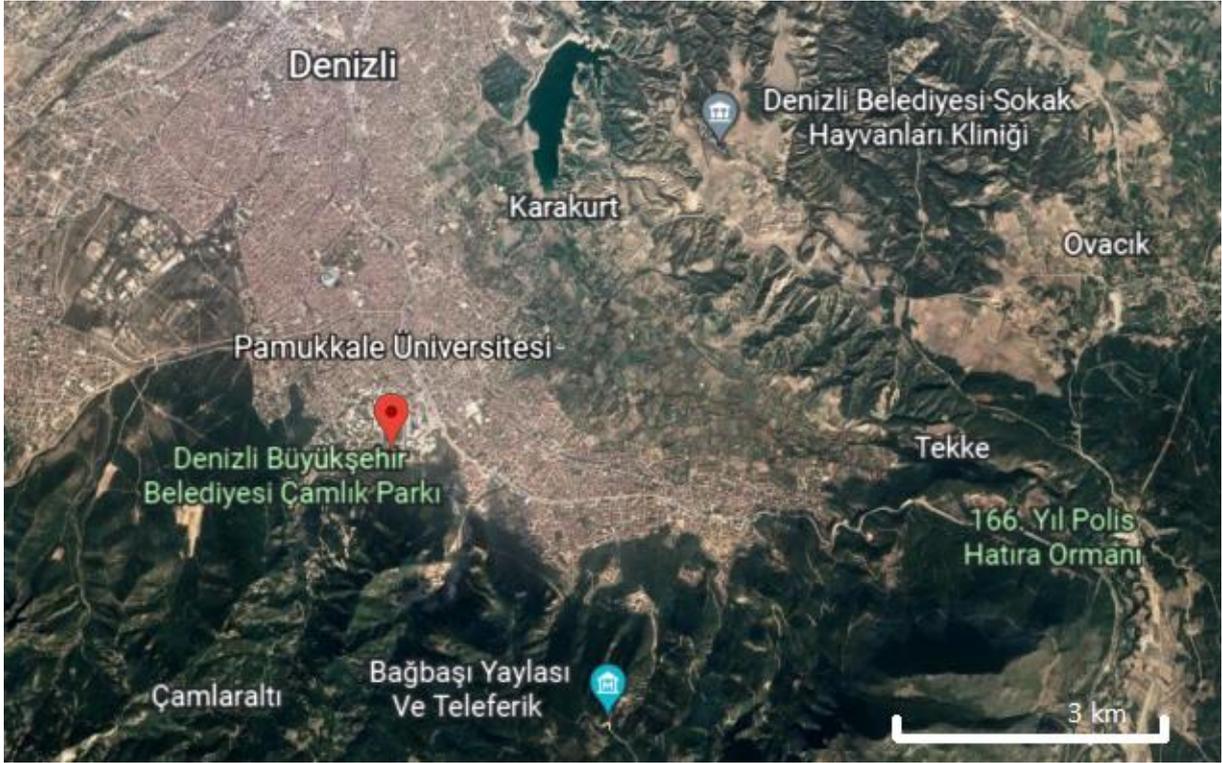

Şekil 2 Pamukkale Üniversitesi Uydu Görüntüsü-1



Şekil 3 Pamukkale Üniversitesi Uydu Görüntüsü-2

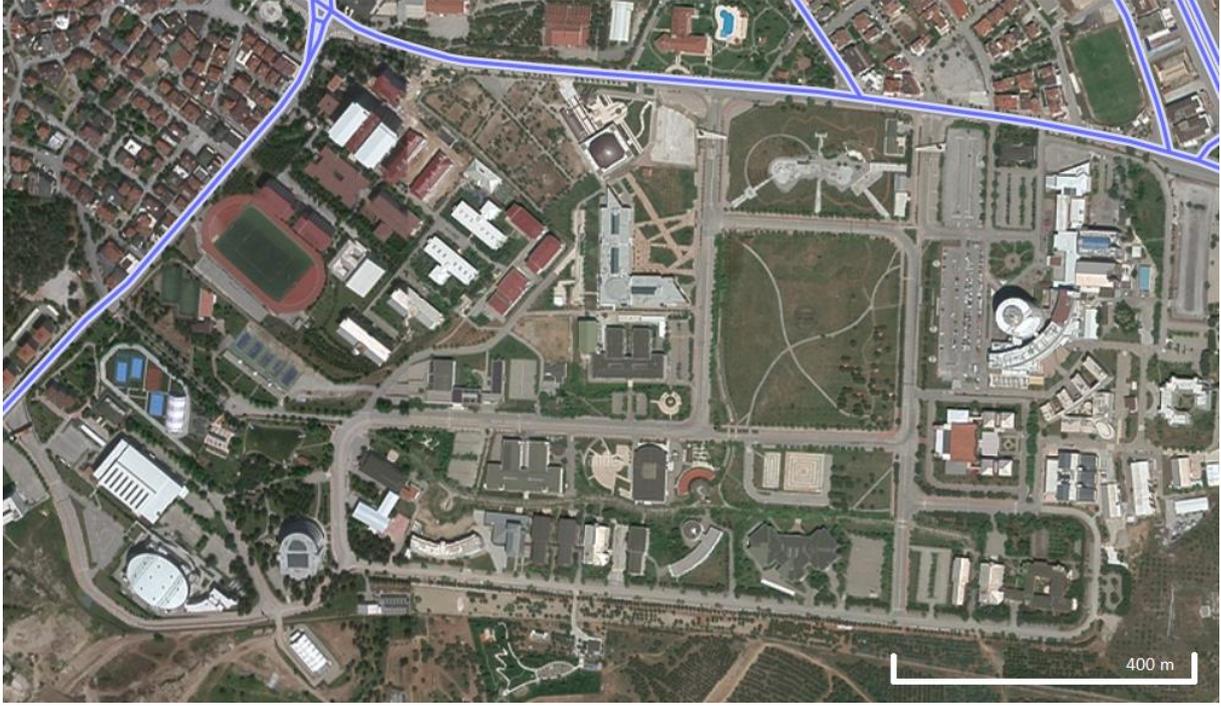

Şekil 4 Pamukkale Üniversitesi Uydu Görüntüsü-3

2.YASAL ÇERÇEVE VE DÜNYA BANKASI OPERASYONEL POLİTİKALARI İLE UYUMLULUK

Bu bölümde ÇSYP'nin hazırlanması sürecindeki gerekliliklerine uyum sağlanan kanun, yönetmelik ve düzenlenmeler ile DB tedbirlerine yer verilmektedir.

2.1.Ulusal Mevzuat

Bu ÇSYP öncelikli olarak Türkiye kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Türkiye'nin çevre mevzuatı ile ilgili temel çerçevesi 11 Ağustos 1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 29.04.2013 tarihli Resmi Gazete'de revize edilen Çevre Kanunu (2872 sayılı) olup, bir dizi yönetmelikle desteklenmektedir. Aşağıda bu proje kapsamında çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve önlenmesi için öncelikli olarak yararlanılacak yönetmelikler belirtilmiştir. Yenileme faaliyetlerinde zaman zaman başvurulabilecek ilgili diğer yönetmelikler ise Ek 4' te verilmiştir.

- ÇED Yönetmeliği, 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sarılı Resmi Gazete (ÇED Yönetmeliği kapsamında değildir.)
- Atık Yönetimi Yönetmeliği, 2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 27 Aralık 2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete
- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete ve 26.03.2010 tarih ve 27333 sayılı Resmi Gazete'de revize edilmiş
- Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete
- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, 8 Haziran 2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete ve son olarak 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete'de revize edilmiş
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 31 Aralık 2014 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete;
- Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, 06 Haziran 2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmi Gazete

- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 04 Haziran 2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete
- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, 25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete
- Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik, 30 Aralık 2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete
- Yine bu proje kapsamında öncelikli etkileri dikkate alınan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında 10 Haziran 2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu ile 30 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunlarla ilgili tüm yönetmeliklere uygun faaliyet yürütülecektir.

Uluslararası Sözleşmeler

- 12/6/1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi
- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi
- Sağlık Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi
- İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi'ne ilişkin 187 sayılı ILO Sözleşmesi
- İnşaat Sektöründe Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'ne ilişkin 167 sayılı ILO Sözleşmesi

Yönetmelikler

- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
- Geçici veya Belirli Süreli İşlerde, İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda, Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
- Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
- Tozla Mücadele Yönetmeliği
- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
- Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
- Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
- Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
- İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
- İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- İşYeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
- İşYeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
- İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
- İş Yerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş Yeri Tehlike Sınıfları Tebliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Ayrıca tüm işçilerin çalıştırılması süresinde temel sigorta haklarının belirlenmesi adına 5510 sayılı ve 16.06.2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu işletilecektir.

2.2. Dünya Bankası Koruma Önlem Politikaları

OP 4.01. Çevresel Değerlendirme

Türkiye Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, projeleri çevresel risklere göre ayırırken, Dünya Bankası Operasyonel Politikaları (OP) 4.01 ‘Çevresel Değerlendirme’ benzer şekilde sınıflandırmaktadır. Çevre Kanunu'nun 10'uncu maddesi; 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ÇED Yönetmeliği’nin ana çerçevesini oluşturmaktadır. Dünya Bankası’nın çevresel ve sosyal koruma önlemleri borçlanıcı ülkenin ÇED Yönetmeliği ve DB’nin çevresel etkiye yönelik OP 4.01 ile örtüşen bir çevresel değerlendirme çalışması gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Bu ÇSYP’ye konu olan proje için değerlendirme yapıldığında; “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” kapsamında Trijenerasyon sisteminin kurulması için gerekli başvuru ve izinler, cihaz seçimi yapılmadığından başlatılamamıştır. Yüklenici, cihaz seçimini yaptıktan sonra yetkili enerji dağıtım şirketine ve yerel gaz dağıtım şirketine başvuruda bulunacaktır. Bu süreçte Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belgeyi temin edecektir.

Basit inşaat faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda da Dünya Bankası Operasyonel Politikaları (OP) gerekliliklerinin uygulanması gerekmektedir. Proje nedeniyle ortaya çıkabilecek önemli sosyal ve çevresel etkilerin, proje sahası yakınlarında bulunan hassas alıcıları (ör. okullar, hastaneler, sağlık ocakları ve evler) etkilemesi beklenmektedir. Bu kapsamda Ç&S ve İSG faaliyetlerinin özenli yönetimi, çevresel ve sosyal etkilerin azaltılmasında yeterli olacaktır.

Proje kapsamında yer alan faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda, ilgili olan/olmayan Dünya Bankası Operasyonel Politikalarına Ek 4’ te yer verilmiştir.

3.ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI KONTROL LİSTESİ

Kınıklı Mah. Üniversite Cad. No:11 20160 Pamukkale / DENİZLİ adresinde bulunan **Pamukkale Üniversitesi**’nde gerçekleştirilecek enerji verimliliği çalışmalarına dair özet bilgiler Tablo 3’te sunulmaktadır. Tablo 3’te sunulmuş olan “ÇSYP Kontrol Listesi” inşaat alanlarındaki ofislerde tüm paydaşların erişimine açık olacak şekilde asılı duracaktır. Şantiye sorumlusu, paydaşlar tarafından gelen soru ve görüşlerin kayıt altına alınması ve cevaplanmasından sorumlu olacaktır.

Tablo 4 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Kontrol Listesi

KURUMSAL VE YÖNETİMSEL	
Ülke	Türkiye / Denizli
Projenin Adı	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi
Proje kapsamı ve aktivitesi	Pamukkale Üniversitesi enerji verimliliği kapsamında bina ıslahı inşaat faaliyetlerinin yapılması.
OP Kriteri	
Çevresel Değerlendirme OP 4.01	<input checked="" type="checkbox"/> Uygulanıyor <input type="checkbox"/> Uygulanmıyor
Doğal Yaşam Alanları OP 4.04	<input type="checkbox"/> Uygulanıyor <input checked="" type="checkbox"/> Uygulanmıyor
Ormanlar OP4.36	<input type="checkbox"/> Uygulanıyor <input checked="" type="checkbox"/> Uygulanmıyor
Haşere Yönetimi OP 4.09	<input type="checkbox"/> Uygulanıyor <input checked="" type="checkbox"/> Uygulanmıyor
Fiziksel Kültürel Kaynaklar OP 4.11	<input type="checkbox"/> Uygulanıyor <input checked="" type="checkbox"/> Uygulanmıyor
Yerli Halk OP/BP 4.10	<input type="checkbox"/> Uygulanıyor <input checked="" type="checkbox"/> Uygulanmıyor
Gönülsüz Yeniden Yerleşim OP/BP 4.12	<input type="checkbox"/> Uygulanıyor <input checked="" type="checkbox"/> Uygulanmıyor
Baraj Güvenliği OP/BP 4.37	<input type="checkbox"/> Uygulanıyor <input checked="" type="checkbox"/> Uygulanmıyor

Uluslararası Suyolları OP/BP7.50	[] Uygulanıyor [X] Uygulanmıyor	
İhtilafı Alanlar OP/BP 7.60	[] Uygulanıyor [X] Uygulanmıyor	
SAHA AÇIKLAMASI		
Sahanın adı	Pamukkale Üniversitesi	
Sahanın yeri	Denizli Pamukkale ilçesi	Saha haritası [X] EVET [] HAYIR
Mülk sahibi	Maliye Hazinesi mülk sahibi olup, alan üniversiteye tahsislidir.	
Coğrafi, fiziksel, biyolojik, jeolojik, hidrografik ve sosyo-ekonomik bağlamın tanımı	<p>Proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alanın zemini tamamen beton kaplı ve geçirimsizdir. Bu sebeple toprak yapısının proje sürecinden etkilenmesi beklenmemektedir. Proje alanına toplu taşıma araçları ile kolaylıkla ulaşabilmek mümkündür. Proje sahasında elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, internet gibi tüm altyapı imkânlarına ulaşılabilir.</p> <p>Proje süresi ve binanın konumu göz önünde bulundurulduğunda inşaat faaliyetlerinin bölgeye olumsuz etkisi olması beklenmemektedir.</p>	
Hastaneler, sağlık birimleri, kamu binaları, evler gibi en yakın hassas alıcıların bulunduğu yerler ve uzaklık?	Proje sahasının yakın çevresinde Yaşar Kımıl Fen Lisesi ve Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi, Denizli Özel Cerrahi Hastanesi, konutlar gibi hassas alıcılar (500 m yarıçap) bulunmaktadır. Ancak, inşaat faaliyetleri süresince alınacak tedbirler ile, hassas alıcıların proje faaliyetlerinden etkilenmesinin önüne geçilecektir.	
Malzeme toplama, özellikle agrega, su, taş için yerler ve mesafe nedir?	Proje aşamasında hazır malzemeler kullanılacak olup yeraltı suyuna ihtiyaç yoktur. Şehir merkezinde yer alan bina, malzeme temininde sıkıntı yaşamayacaktır.	
MEVZUAT		
Kanalizasyon sistemi, elektrik, su şebekesi vb. Proje tarafından kullanılan altyapıları belirleyin.	<p>Renovasyon çalışmaları sırasında, bölgede halihazırda mevcut olan kanalizasyon, elektrik ve su şebekeleri kullanılacaktır.</p> <p>Evsel atıklar, Pamukkale Belediyesi'nin hizmetlerinden faydalanılarak bertaraf edilecek, diğer atıklar için ise uygun depolama alanları oluşturulup lisanslı firmalarca bertarafının yapılması sağlanacaktır. Proje özelinde herhangi bir altyapı hizmet alımı gerekmesi durumunda mevcut altyapı imkanları değerlendirilecek ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir.</p>	

<p>Proje faaliyeti için geçerli olan ulusal ve yerel mevzuatı ve izinleri belirleyin (örneğin 1/1000 veya 1/5000 ölçekli ana plan düzenlemeleri, inşaat ruhsatı vb.)</p>	<p>Mevcut Yapı Ruhsatları, GES tesisi ve Trijenerasyon/kojenerasyon sistemleri başvurusu için kullanılacaktır. Trijenerasyon/kojenerasyon sistemlerinin bina dışına kurulması durumunda Yapı ruhsatında tadilat yapılarak trijenerasyon binası yapı ruhsatına ek bina olarak ilave edilecektir.</p> <p>Lisanssız Elektrik Üretimi için alınacak belgeler aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yetkili Elektrik Dağıtım Şirketi-Çağrı Mektubu, • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü-Verimlilik belgesi • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kojen Tesisi Verim Belgesi • TEMSAN(Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. • GES Statik Projeleri-Üniversite Onayı • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uygunluk Yazısı • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü -ÇED Muafiyet Yazısı • İlçe Belediyesi-GES Uygunluk Yazısı(İmar Yönetmeliği Mevzuatına göre) • İlçe Belediyesi-Trijenerasyon Tesisi Kurulumu Uygunluk Yazısı • LIHKAP Onaylı Aplikasyon Krokileri • Zemin Etüt Raporu <p>“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” kapsamında Fotovoltaik panel kurulumu için yetkili enerji dağıtım şirketine başvuru Müşavir tarafından başlatılmıştır.</p> <p>“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” kapsamında Trijenerasyon sisteminin kurulması için gerekli başvuru ve izinler, cihaz seçimi yapılamadığından başlatılamamıştır. Yüklenici, cihaz seçimini yaptıktan sonra yetkili enerji dağıtım şirketine ve yerel gaz dağıtım şirketine başvuruda bulunacaktır. Bu süreç Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışındadır.</p>
<p>PAYDAŞ İSTİŞARE SÜRECİ</p>	
<p>Paydaş danışma sürecinin ne zaman/ nerede gerçekleştiğini belirleyin.</p>	<p>Tüm paydaşların katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı 14.12.2022 tarihinde sanal olarak gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Bu toplantıda projenin amacı, hedefleri ve proje kapsamında yapılacak enerji verimliliği işlerine dair teknik detaylar, olası sosyal ve çevresel etki ve riskleri ve bu etki/risklerin yönetimi konusunda hangi önlemlerin (kim tarafından, ne zaman) alınacağı ve bu önlemlerin nasıl/hangi aralıklarla izleneceği, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kapsamında hazırlanan plan ve nasıl uygulanacağı, şikayet çözüm mekanizması (SÇM) ve bu mekanizmanın nasıl işlediği ile ilgili bilgiler uzmanlar tarafından katılımcılar ile paylaşılmıştır.</p> <p>Ayrıca bilgilendirme amaçlı olarak projelere özel tanıtım materyalleri (broşür, vb.) hazırlandığı ve bu materyallerin inşaat yapım sürecinde, bina girişinde masa, bilgilendirme panoları, vs. üzerinden sergilenerek ilgili paydaşlara ulaştırılmasının sağlanacağı bilgisi katılımcılara aktarılmıştır.Bilgilendirme toplantısına Pamukkale Üniversitesi’nden farklı pozisyonlardan (Öğretim üyesi, öğrenci, hastane müdür yardımcısı vb.) katılım sağlanmıştır.</p>

<p>Menfaat sahiplerinin ortaya çıkardığı konu ve endişelerin kısa özeti</p>	<p>Paydaş bilgilendirme toplantısı sonunda gerçekleştirilen Soru-Cevap Oturumu sırasında katılımcılardan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Çalışmaların ne zaman başlayacağı, • Hastane otoparkına PV çalışması yapılıp yapılmayacağı, • Havuz ısıtmasının maliyeti, • Hastane için aydınlatma çalışmasının yapılıp yapılmayacağı, <p>konusularında sorular gelmiştir. Toplantıya ait detaylı rapor Ek-7’de yer almaktadır.</p>
<p>KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME</p>	
<p>Herhangi bir kurumsal kapasite geliştirme söz konusu olacak mı?</p>	<p>Proje kapsamında, Müşavirin Yüklenici personeline vereceği eğitimler sonucunda yüklenici firmanın kurumsal kapasitesinin gelişmesi beklenmektedir. Bu eğitimler aşağıda listelenmiştir. Eğitim süreleri 60 dk. dır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Çevresel Etkiler - Atık Yönetimi - Çevresel Acil Durumlara Tepki - Enerji Verimliliği - Kültürel Mirasın Korunması ve Tesadüfi Buluntu - Anayasal Haklarımız - Biyolojik Çeşitlilik - Paydaş katılımı/bilgilendirme faaliyetleri - Şikayet Çözüm Mekanizması, - Cinsiyet Temelli Şiddet/Cinsel Sömürü/Cinsel Saldırı/Cinsel Taciz

4. ÇEVRESEL VE SOSYAL TARAMA

Proje kapsamında, enerji verimliliği çerçevesinde Tablo 1 Proje Sahası Bilgileri'nde bahsedilen basit inşaat faaliyetleri yürütülecektir. Bu faaliyetlerin bina faydalanıcılarının, binaların yakın çevresinde yerleşik bulunan paydaşların ve çevrenin üzerine oluşturabileceği çevresel ve sosyal etkiler Tablo 3'te yer almaktadır. Ayrıca yapılacak işin vasfından dolayı ve üzerine çevresel ve sosyal etki olmayacak parametreler Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 5 Dünya Bankası Operasyonel Politikalar Çevresel ve Sosyal Tarama

ÇEVRESEL / SOSYAL TARAMA				
Saha etkinliği aşağıdakilerden herhangi birini içerecek mi?	Faaliyet	Durum		Uygulanacak Tedbirler
	Su Kaynakları/Su kalitesi	<input type="checkbox"/> Evet	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Tablo 4
	Bina rehabilitasyonu ve küçük çaplı inşaat işleri	<input checked="" type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Bölüm 6
	Hava kalitesi	<input checked="" type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Bölüm 6
	Habitat (Doğal yaşam alanlarına, ormanlara ve/veya korunan alanlara etkiler) Bitkisel toprak ve alt toprak	<input type="checkbox"/> Evet	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Tablo 4
	Dış Ortam Gürültü Kirliliği	<input checked="" type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Bölüm 6
	Atık Oluşumu	<input checked="" type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Bölüm 6
	Tehlikeli ⁵ ve toksik materyaller	<input checked="" type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Bölüm 6
	Tıbbi atıkların yönetimi	<input type="checkbox"/> Evet	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Tablo 4
	Enerji Verimliliği	<input checked="" type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Bölüm 6
	Bina Islahı	<input checked="" type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Bölüm 6
	Fiziksel ve Kültürel Kaynaklar	<input type="checkbox"/> Evet	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Tablo 4
	Arazi edinimi ⁶	<input type="checkbox"/> Evet	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Tablo 4
	Trafik ve Yaya Güvenliği	<input checked="" type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Bölüm 6
Diğer Hususlar <ul style="list-style-type: none"> İSG Bilgilendirme Bina hizmetlerinin devamlılığı 	<input checked="" type="checkbox"/> Evet <input checked="" type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Hayır <input checked="" type="checkbox"/> Hayır	Bkz. Bölüm 6 Bkz. Bölüm 6 Bkz. Tablo 4	

⁵ Zehirli/tehlikeli materyal asbest, zehirli boyalar, zararlı çözücüler, floresan gibi cıva atıklarını, kurşunlu boyanın sökülmesi vb. ihtiva etmektedir.

⁶ Arazi edinimi insanların yerinden edilmesi, geçim kaynaklarının değişimi, özel mülkiyetin gaspını kapsamaktadır. Bu durum, satın alınan ve / veya devralınan araziler için geçerlidir ve bahsi geçen şekilde elde edilen arazilerde yaşayanlar ve/veya gecekondulu sakinleri ve işyeri sahiplerini etkilemektedir.

Tablo 6 Proje Kapsamında Çevresel – Sosyal Etkisi Beklenmeyen Durumlar

ETKİ PARAMETRESİ	ETKİ AZALTACAK / ALINACAK ÖNLEM
TIBBİ ATIK YÖNETİMİ	<ul style="list-style-type: none"> Proje süresi kısa olduğu için revir oluşturulmayacağı düşünülmekte, bu sebeple tıbbi atık oluşmayacağı ön görülmektedir. Revir oluşturulması durumunda, Tıbbi atıkların geçici olarak depolanması, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 14. Maddesi ve işleme tesislerine taşınması da 15. Maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir.
SU KAYNAKLARI / SU KALİTESİ	<ul style="list-style-type: none"> Proje alanı içerisinde yüzey üstü ve yüzey altı su kaynağı bulunmadığından, projede direkt çevresel etki oluşması beklenmemektedir. İnşaat çalışmaları sırasında inşaat çalışanlarının temizlik ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için bina imkânlarının kullanılmayacağı durumlarda, inşaat sahasına getirilecek mobil tuvaletler ve lavabolar kişilerin kullanımına sunulacaktır.. Bu ihtiyaçlar sonucu oluşacak atıksular belediye vidanjörlerince sahadan uzaklaştırılacaktır. İnşaat sahasının bulunduğu bölgedeki kanalizasyon sisteminin kullanılmaması, aksi durumların oluşması halinde foseptik oluşturulacak, atıksu sızdırmaz alanlarda biriktirilecek ve bağlı bulunan Belediye'ye ait vidanjörler ile sahadan uzaklaştırılacaktır. Yağışlar ile oluşan yüzey suları için proje sahasında uygun erozyon ve tortu / sedimantasyon kontrol önlemleri alınacaktır. Tortuların saha dışına taşması ve yakındaki su alıcı ortamlarına bulaşması engellenecektir. Malzemeler akış yolu üzerine depolanmayacak gerekli ise geçirimsiz örtüler kullanılarak yağmursuyu ile irtibatı kesilecektir.
HABİTAT (DOĞAL YAŞAM ALANLARINA, ORMANLARA VE / VEYA KORUNAN ALANLARA ETKİLER) VE BİTKİSEL TOPRAK VE ALT TOPRAK	<ul style="list-style-type: none"> Faaliyetlerin gerçekleştirildiği yakın çevrede doğal yaşam alanları, sulak alanlar ve koruma alanı olarak kabul edilen alanlar bulunmamaktadır. Mevcut proje alanında zemin daha çok sızdırmaz beton alandan oluştuğu için toprağa olumsuz etki beklenmemektedir.
FİZİKSEL VE KÜLTÜREL KAYNAKLAR	<ul style="list-style-type: none"> Yenileme faaliyetlerine konu binalar tarihi bina vasfına sahip değildir. Proje sahasında toprak üstü eser bulunmadığından Kültürel Mirası etkileyecek bir durum beklenmemektedir. Yine kazı çalışmaları öncelikli olarak öngörülmediğinden, toprak altı eserlerin gün yüzüne çıkması da beklenmemektedir. <p>Kazı yapılması ve çalışma sırasında rastlantısal bulgu tespit edilmesi durumunda ise:</p> <ul style="list-style-type: none"> İnşaat çalışmaları sırasında bulunan eserler “rastlantısal bulgu” olarak belirtilecek ve kayıt altına alınacaktır. Rastlantısal bulgu sonrasında izlenecek ve uygulanacak adımlar için “Rastlantısal Bulgu Prosedürü” hazırlanacaktır. Rastlantısal bulgular ile ilgili olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları bilgilendirilecek ve şantiye sahasının bulunduğu alandan sorumlu olan Koruma Kurulu'ndan gerekli onayın gelmesi beklenecektir. Bu bekleme süresince herhangi bir inşaat çalışması gerçekleştirilmeyecektir. Rastlantısal bulgular ile ilgili olarak alandaki mevcut faaliyetin ertelenmesi ya da zamanlamasının yeniden düzenlenmesi için, ilgili tüm hükümlerin yürürlüğe girmesi sağlanacaktır. Bu konuda yapılan tüm yazışmalar, alınan tüm kararlara uygun olarak ÇSYP güncellenecek ve tüm dokümanlar ÇSYP'nin ekinde sunulacaktır.

ARAZİ EDİNİMİ	<ul style="list-style-type: none">• Projenin başlangıç ve farklı aşamalarında arazi edinimi ya da yeniden yerleşim durumlarının oluşması beklenmemektedir. Çünkü binanın bulunduğu alan maliye hazinesine aittir. Proje kapsamında ek alan ihtiyacı olmayacaktır.• Proje kapsamında OP 4.12 Gönülsüz Yeniden Yerleşim'in uygulanmasını gerektirecek hiçbir arazi (kamu binaları inşa etmek için belirlenmiş) finansman için uygun olmayacaktır.
DİĞER HUSUSLAR / BINA HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI	<ul style="list-style-type: none">• Faaliyet süresince binanın hizmetlerini engelleyecek bir durum yaşanması beklenmemektedir, Bölgesel müdahaleler, bina yönetimleri ile planlanarak faaliyetlerini yürütebilmesi sağlanacaktır.• Tüm bu sürecin sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlem ve iyileştirilmeler yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

5. PAYDAŞ KATILIMI VE ŞİKÂyet ÇÖZÜM MEKANİZMALARI

İdare tüm paydaşların proje sürecinin sahada nasıl yürütüleceği hakkında bilgi sahibi olması ve varsa paydaşların itiraz ve önerilerini alabilmek için bu ÇSYP'yi on gün süre ile çalışma yapılan binada askıda tutacaktır. Askı sürecinin tamamlanması akabinde Paydaş Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecektir. Düzenlenecek toplantının yöntemi pandemi koşulları çerçevesinde belirlenecektir. Ayrıca İdare bilgilendirme amaçlı alt projelere özel tanıtım materyalleri (broşür, poster, vs.) hazırlayacak ve bu materyallerin ilgili paydaşlara ulaştırılmasını sağlayacaktır.

Şikâyet Çözüm Mekanizması (ŞÇM), herhangi bir paydaşın projenin nasıl planlandığı, inşa edildiği veya uygulandığı konusunda bir şikâyet veya öneri sunmasını sağlayan bir süreçtir.

ÇŞİDB'nin halihazırda hem telefon hem de web sitesi üzerinden erişilebilen bir çağrı merkezi⁷ bulunmaktadır. Bu çağrı merkezi, Bakanlığın tüm faaliyetleri ile ilgili konuları kapsamaktadır. İdare, KABEV Projesi kapsamında kamu binalarında yürütülecek faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek şikâyet/görüş/önerilerin toplanması, değerlendirilmesi ve çözümlenmesi amacıyla, Proje uygulaması başlamadan önce KABEV Projesi'ne özel olarak şeffaf ve kapsamlı bir ŞÇM geliştirecektir. ŞÇM, ilgili tüm paydaşların gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında şikâyet/görüş/önerilerini ilgili kişi ve kurumlara ulaştırabilmesine yardımcı olacak ve paydaşların projeye katılımlarını güçlendirecektir. KABEV Projesi kapsamında şikâyetler birden fazla seviyede ele alınacaktır. (a) yüklenici düzeyinde; (b) müşavir düzeyinde;(c) ÇŞİDB İl Müdürlükleri düzeyinde; (d) ulusal düzeyde ÇŞİDB Proje Uygulama Birimi düzeyinde (PUB).

- a) **Yüklenici Seviyesi:** İnşaat işlerini yürütmek için atanan her yüklenici, herhangi bir paydaş (kamu binası yönetimi, bina kullanıcıları, ziyaretçiler, yerel topluluklar veya yararlanıcılar,proje çalışanları vb.) tarafından dile getirilen şikâyetleri/endişeleri/görüşleri / tavsiyeleri Şikâyet Çözüm Mekanizması Prosedürüne uygun olarak almak, kaydetmek ve mümkünse çözümlenmekten sorumlu olacaktır. Yüklenici, Projede görev alan tüm personeline ŞÇM'yi kullanabileceğini ve personelden gelecek şikâyetlerin ileride iş akdinin yenilenmesi hususunda bir engel teşkil etmeyeceğinin garantisini verecektir. KABEV Projesi kapsamında yapılan inşaat işleri nedeniyle Yüklenici şikâyetleri / endişeleri / görüşleri / tavsiyeleri çözemezse, bunları ilgili kişi / kurumlara yönlendirmekle yükümlüdür. Yükleniciler ayrıca çözülmüş ve çözülmemiş şikâyetler / endişeler / görüşler / tavsiyeler dahil olmak üzere tuttıkları kayıtları haftalık olarak Müşavire rapor olarak sunacaklardır.
- b) **Müşavir Seviyesi:** Yüklenici düzeyinde ele alınamayan şikâyetler / endişeler / görüşler / tavsiyeler, İnşaat Kontrolörü olarak atanan Proje Yöneticisi tarafından ele alınacaktır. Proje Yöneticisi Şikâyet Çözüm Mekanizması Prosedürüne uygun olarak, bir durum raporu düzenleyerek yüklenicinin sorumluluklarını hatırlatacak ve sorunu çözmek ve gerekli düzeltici eylemlerin uygulanmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. Müşavir, Projede görev alan tüm personeline ŞÇM'yi kullanabileceğini ve personelden gelecek şikâyetlerin ileride iş akdinin yenilenmesi hususunda bir engel teşkil etmeyeceğinin garantisini verecektir. Proje Yöneticisi şikâyetleri / endişeleri / önerileri / tavsiyeleri çözemezse, bunları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ'ına yönlendirmekle yükümlüdür. Müşavir, hem kendisine doğrudan gelen

⁷ <https://181.csb.gov.tr/>

şikayetleri/endişeleri/önerileri hem de yüklenici tarafından iletilenleri haftalık olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na rapor olarak sunacaktır.

- c) **Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri Seviyesi:** KABEV Projesi kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak alınan şikayet / endişe / görüş / önerileri mümkün olduğu ölçüde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü sorumlu olacaktır. Müdürlükler ayrıca, kendisine ulaşan konuları çözsün ya da çözmesin, alınan tüm şikâyet / kaygı / görüş / önerileri derhal İdare'ye iletacaktır.
- d) **ÇŞİDB Seviyesi:** KABEV Projesi kapsamında, ÇŞİDB yukarıda belirtilen seviyeler aracılığıyla paydaşlar tarafından dile getirilen tüm şikayet / endişe / görüş / tavsiyeleri toplamak, kaydetmek ve çözmekle sorumludur. ÇŞİDB, toplanan şikâyeti / endişeyi / görüşü / tavsiyeyi 30 gün içinde çözmekten ve sonuç hakkında şikâyet / endişe / görüşü / tavsiyeyi sahibini bilgilendirmekten sorumludur.

Cinsiyet temelli şiddet ve cinsel sömürü ve taciz konularındaki şikâyetler için gizlilik bakımından Ek-2 de verilen web tabanlı şikâyet sisteminin kullanılması önerilmektedir. Gizliliğin sağlanabilmesi adına, söz konusu web tabanlı şikâyet sistemine yetkilendirilmiş bir personelin giriş yetkisi olacaktır.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurumsal olarak şikâyet ve öneri toplama adına birçok alternatif yöntem belirlemiştir.

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Merkezi (CİMER) gibi ulusal şikâyet mekanizması başta olmak üzere, şikâyet ve önerileri İdare'ye iletme kanalları aşağıda verilmiştir:

- **E-posta** yigmenerji@csb.gov.tr
- **ÇŞİDB Çağrı Merkezi** Alo 181
- kabev.org web adresinde yer alan şikâyet/öneri formu
- **Alo181.csb.gov.tr**/web adresinde yer alan Bilgi/Şikâyet Başvuru Formu
- İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlükleri
- ÇŞİDB projenin internet sitesinde yer alan şikâyet formu (<https://kabevanket.csb.gov.tr/sikayet.jsp>)

İnşaat Yüklenicisi kamu binalarının yenilenmesi sırasında alınan şikâyet/görüş/önerileri şikâyetleri alınması, kaydedilmesi ve çözülmesinden sorumlu olacaktır yönetecektir. İnşaat işlerini yürütmek üzere atanan her yüklenici, kamu binası yönetimi ve çalışanları, ziyaretçileri ve yararlanıcılar tarafından inşaat çalışmaları konusunda gelen nedeniyle yapılan şikâyet/görüş/önerileri şikâyetleri almak, kaydetmek için bir şikâyet mekanizması tanımlayacaktır. Yüklenici şikâyet/görüş/önerileri şikâyetleri ve önerileri Ek - 3 ve Ek - 4'te verilen Şikâyet ve Öneri Formu ve Şikâyet Kapatma Formu aracılığı ile kayıt altına alacaktır toplayacaktır. Sözlü gelen şikâyet/görüş/öneriler şikâyet ve önerileri ise, Yüklenicinin sorumlu personeli tarafından Şikâyet ve Öneri Formu bu formu doldurarak kayıt altına alacaktır. Yüklenici kayıt altına aldığı şikâyetleri her hafta başı Proje Müdürü'ne göndermekle yükümlüdür. Proje müdürü gelen şikâyet/öneri/talepleri haftalık olarak ÇŞİDB'ye bildirmekle yükümlüdür. Farklı kanallar aracılığıyla toplanan şikâyet/görüş/öneriler İdare tarafından kayıt altına alınarak 30 gün içerisinde cevaplanacaktır. Şikâyet/görüş/öneriler ile ilgili kayıtlar, ÇŞİDB tarafından, düzenli olarak DB ile paylaşılacaktır. Ayrıca DB'nin desteklediği projelerden olumsuz şekilde etkilendiğini düşünen kişi ya da topluluklar şikâyetlerini, proje seviyesinde mevcut olan Şikâyet Çözüm Mekanizması (ŞÇM) aracılığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na veya

Dünya Bankası'nın Şikâyet Çözüm Servisi (SÇS) (<https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service>) aracılığı ile DB'ye iletebilirler.

Projeden etkilenen topluluklar ya da kişiler, şikâyetlerini ayrıca Dünya Bankası Bağımsız Teftiş Paneline de iletebilirler. Bu panel DB'nin performans kriterlerinin bir veya birkaçının ihlali sonucu şikâyet eden kişi ya da toplulukların zarara uğrayıp uğramadığını veya uğratılabileceğini belirler. Panel, kendisine ulaşmış şikâyetler hakkındaki endişelerini DB'ye doğrudan iletebilir. Bu aşamada DB şikâyetler hakkında cevap verme fırsatına sahip olur.

6. ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSKLER & ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

Tablo 7 Çevresel ve Sosyal Riskler & Etkileri ve Alınacak Önlemler

PROJE AŞAMALARI	RİSK VE ETKİLER	ÖNERİLEN ETKİ AZALTICI ÖNLEMLER	SORUMLU KURUM
FAALİYETİN UYGULANMASI SIRASINDA (YAPI İŞLERİ)	BİLGİLENDİRME	<ul style="list-style-type: none"> İnşaat faaliyetleri başlamadan önce bölge halkı ve ilgili tüm paydaşlar, (i) gerçekleştirilecek çalışmalar ve alınacak önlemler konusunda fiziki ya da uzaktan yapılacak bir toplantı, (ii) alt proje özelinde hazırlanan farklı iletişim materyalleri (broşür, poster, vs.), (iii) bu ÇSYP'nin binada 10 gün süre ile askıda kalması aracılığı ile bilgilendirilecektir. Ek olarak, projenin uygulanma süresi boyunca bu ÇSYP'nin nihai versiyonu şantiye alanında erişilebilir olacaktır. Şantiye alanında; inşaatın başlama, bitiş tarihleri ve çalışma periyotları ile alınan izinlere ilişkin bilgileri içeren, inşaat alanında herkesin kolayca görebileceği bir tabela yerleştirecektir. İnşaat faaliyetleri esnasında oluşabilecek büyük çaptaki çevresel kazalar ve işyeri kazaları (yaralanma, ölümle sonuçlanan kazalar, çevresel dökülmeler gibi çevre kazaları, vb.) 3 iş günü içinde ÇŞİDB'ye bildirilecek ve 30 işgünü içinde kök sebep analiziyle birlikte kaza raporu ÇŞİDB'ye gönderilecektir. ÇSİDB de bu bilgileri DB ile eşzamanlı olarak paylaşacaktır. Şantiye alanı girişinde tedarikçiler, çalışanlar ve altyüklenicilerin göreceği ve okuyabileceği şekilde iş güvenliği hedefleri ve İSG politikası yayınlanacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> İdare Müşavir Yüklenici

	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	<ul style="list-style-type: none"> • Enerji verimliliği kapsamında binanın yenilenmesi çalışmalarının bir bütünü ve yapılacak tüm renovasyon faaliyetleri sürdürülebilirlik faaliyetidir. Fotovoltaik panel kurulması faaliyetleri enerji verimliliği kapsamındadır. • Projenin öncesi ve sonrasında yapılacak anket çalışmaları ile enerji verimliliği çalışmalarının toplumsal ve ekonomik katkısının izlenmesi sağlanacaktır. • Sürdürülebilir kalkınma perspektifinde projede görev alacak personelde kadın çalışan istihdamı öncelikli olarak gözetilmelidir. • Projenin bölgedeki ekonomik kalkınmaya (bölgeden işçi istihdamı, bazı malzeme tedarikinin bölgeden temini ve yerel işletmelerin kullanılması) devamlı olmasa da proje süresince fayda sağlaması beklenmektedir. • Misafir veya kurum çalışanı otoparkına PV Panel yerleştirme uygulaması başlamadan önce, bu otoparkın günlük araç kullanım sayısı belirlenecek ve belirlenen araç sayısı kadar bir alan idare ile fikir alışverişinde bulunularak alternatif misafir park alanı olarak tahsis edilecektir. • Alternatif alan belirlendirdikten sonra otopark kullanıcıları için alternatif park alanını tarifler yönlendirici işaretler yerleştirilecektir. 	<ul style="list-style-type: none"> • İdare • Müşavir • Yüklenici
--	--------------------------	---	---

	İSG	<ul style="list-style-type: none"> • Şantiye sahasına görevi olmayan üçüncü kişilerin girmesi engellenecektir. • Şantiye sahasında görev alacak personelin listesi aldığı eğitimler liste halinde sunulacak, uygun eğitim ve kişisel koruyucu donanıma sahip çalışanlar yaka kartları ile şantiye sahasına girecektir. • 18 yaşından küçüklerin şantiye sahasın girmesine izin verilmeyecektir. • Şantiye sahasında sigara içilebilecek alanlar yüklenici tarafından belirlenecektir. • Yeme – içme ve dinlenme için çalışma alanından ayrı yerde konteynerler yüklenici tarafından ayarlanacaktır. • İşçilerin kullanımı için WC konteynerleri, yüklenici tarafından ayarlanacak, hijyen için tüm malzemeleri içerecek ve atıksu için bölgedeki kanalizasyon altyapısı kullanılacaktır. • İşçilere temiz kullanım suyu ve içme suyu temin edilecektir. • Yüklenici, çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak ve uluslararası en iyi uygulamaları ve Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlanan Covid-19 ile ilgili sağlık ve güvenlik tedbirleri de dahil olmak üzere, Türk Mevzuatı uyarınca uygun kişisel koruyucu donanımları (KKD) sağlayacaktır (her zaman baret kullanımı, gerekli olan durumlarda maske, koruyucu gözlük, kemer ve güvenlik ayakkabısı vb. kullanımı). • Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilecek ve bunun için soyunma alanları oluşturulacaktır. • Orta ve büyük ölçekli işyeri kazalarının oluşması halinde, kaza araştırması yapılacak ve raporlanacaktır. • Sağlık ve güvenlik olayları, tedavi gerektiren kazalar, yaralanmalar ve tüm ölümlere ilişkin durumlar üç (3) iş günü içinde ÇŞİDB'ye bildirilecek ve 30 işgünü içinde kök sebep analiziyle birlikte kaza raporu ÇŞİDB'ye gönderilecektir. • Yüksekte çalışma önlemleri, planları, eğitimleri hazırlanacaktır. • Ekipman bakım - onarım planları, sorumlu kişilerin tayini yapılacaktır. • Malzemeler için alım, sevkiyat süreçleri ile depolama alanlarının planlamaları yapılacaktır. • Yüklenici her on (10) işçisinden birisine İlk Yardımcı Sertifikası aldırarak yükümlüdür. Yüklenicinin sahada bulunan işçi sayısının 10'un altında olması durumunda, Yüklenici en az bir (1) ilk yardımcı bulundurmakla yükümlüdür. • Tehlikeli kimyasallarla çalışma prosedürü hazırlanacak ve malzeme depolama alanları oluşturulacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir <p>(Kontrolörlük faaliyetleri)</p>
--	-----	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Mesleki yeterlilik belgelerinin değerlendirilmesi ve teminini sağlanacaktır. • İşçiler için yıllık iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ek olarak her yeni başlayan işçiye verilmek üzere sahadaki kuralları ve güvenlik önlemlerini içeren işbaşı eğitimleri hazırlanacaktır. • İnşaat alanı güvenli giriş eğitimi hazırlanacaktır. (ziyaretçiler için) • Sahalarda kullanılacak iş ekipmanlarının bakım formlarının temin edilecektir. • Sahaya girecek tüm kaldırma araçları, basınçlı kap ve kazanların periyodik kontrollerinin kontrol edilmesi ve giriş onayının verilmesi sağlanacaktır. • Sahaya girecek tüm makine, ekipman (iskeleler dahil) ve el aletlerinin TSE standartlarına uygunluğunun ve CE belgesinin kontrol edilmesi ve giriş onayının verilmesi sağlanacaktır. • Kimyasal maddelerin sahaya girişi geçerli malzeme güvenlik bilgi formlarının kontrolünden sonra yapılacaktır. • Haftalık ve aylık saha İSG toplantıları yapılacaktır. • Sahada yürütülecek her faaliyet için yapım metodu ve risk değerlendirmesi yapılacaktır. • Gece çalışması, yüksekte çalışma, kazı işleri kaynak işleri vb. çalışmalar için iş izin sistemi kurulacaktır. • Bakım onarım çalışmaları tehlikeli gerilimle çalışmalar için kilitle etiketle sistemi kurulacaktır. • Sahada İSG uygunsuzluklarına ilişkin disiplin uygulaması sistemi kurulacak ve tüm çalışanlara bu konuda eğitim verilecektir. • Yeni ekipmanlar ve yenilikler olduğunda tüm çalışmaların güncellenmesi yapılacaktır. • Covid-19 süreci içinde şantiyelerde dezenfektan bulundurulacak ve saha girişlerinde ateş ölçümleri yapılacaktır. • Covid-19 da dahil olmak üzere herhangi bir salgın veya pandemi/bulaşıcı hastalık durumunda Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlanan rehberlik, yönergeler ve tavsiyelere uygun hareket edilecek ve tüm ilgili gerekli tedbirler hem çalışanlar için hem de çalışma yerleri için iş sağlığı ve güvenliği bakımından alınacaktır. • Projenin inşaat faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek ve acil müdahale gerektiren durumların (yangın, deprem, vs.) kontrol edilebilmesi için, toplum ve 	
--	--	--	--

		<p>çevre sağlığını da kapsayacak olan prosedürler hazırlanacak ve tüm çalışanlar ile paylaşılacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sahaların uygun şekilde işaretlenmesi (uyarı levhaları ile) sağlanacak, çalışanlar sahada uyulacak kurallar ile ilgili bildirecektir. • Tüm çalışanlar çalışma koşulları hakkında bilgilendirilecektir, • Çalışanların “İş Sağlığı ve Güvenliği” ve iş başı eğitimlerinin hazırlanması ve uygulanması, tüm çalışma süresini kapsayacak eğitim planlamasının yapılması (çalışanlar, SGK ilgili mevzuatı ve İş kanunundan doğan tüm hakları, sorumlulukları ve etik davranış kuralları konusunda bu eğitimler kapsamında bilgilendirilir.) • Çalışanlar için çalışma sahası ve gerçekleştirilecek işlerle ilgili olası riskleri belirten çalışma kuralları da dâhil olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri ve iş güvenliği toplantıları gerçekleştirilecektir. Bunların arasında, çalışanlara Covid-19 semptomları, nasıl korunması gerektiği ve semptomlar görüldüğünde ne yapılması gerektiği ile ilgili düzenli eğitimlerin verilmesi bulunacaktır. • İnşaat faaliyetleri nedeni ile uzun ya da kısa vadede elektrik, su, doğalgaz kesintisi olacak ise bu durumda gerekli güvenlik önemleri alınacak ve bina kullanıcıları kesintiden en az üç gün önce bilgilendirilecektir. • Çalışanların sağlık taramaları, işe giriş evrakları (özlük dosyaları), eğitim dokümanları, KKD zimmet tutanakları, Noter onaylı tespit – öneri defteri gibi İSG yasal mevzuatı kapsamında hazırlanması ve temin edilmesi gereken tüm evraklarının sahalarda eksiksiz olarak yer alması gereklidir. Tüm bu dokümanlar, Müşavir ve Bakanlık denetimleri için sunuma hazır olacaktır. • Çalışanların işe başlamadan önce çalışmaya uygun olduklarının onaylanması ve bilinmeyen sağlık sorunları olan veya başka bir risk altında olan çalışanlara özel önem gösterilecektir. • Çalışanların ve sahaya giren diğer kişilerin ateşlerinin ölçülmesi ve kayıt altına alınmasıyla da sahaya girmeden önce ya da sahaya girerken kendilerinin beyanda bulunmaları sağlanacaktır. • Öksürme kuralları, el hijyeni ve sosyal mesafe tedbirleri gibi Covid-19 özelindeki belirli hususlara odaklanarak işe başlamadan önce çalışanlara günlük bilgilendirmeler yapılacaktır. • Çalışanlardan, olası semptomlara (ateş, öksürük) karşı kendilerini izlemelerinin istenmesi ve semptomların bulunması ya da kendilerini iyi hissetmemeleri halinde şeflerine bilgi vermeleri istenecektir. 	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Etkilenen bir alandan gelen bir çalışanın ya da enfekte bir kişiyle temasta bulunan bir çalışanın sahaya 7 gün boyunca girmesi önlenecektir. • Hasta çalışanların sahaya girmesine engel olunması, bu çalışanların gerekli olması halinde yerel sağlık tesislerine gönderilmesi sağlanacak ya da 7 gün boyunca evde karantinada kalmaları istenecektir. • İSG başlığı altında görev – yetki ve sorumlulukları belirten organizasyon şeması oluşturulacak ve iletişim bilgileri de eklenecektir. • İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu gerekli sertifikasyon ve deneyime sahip bir personel sahada görevlendirecektir. • İnşaat çalışmaları sırasında kamu bina girişlerinde değişiklik yapılması durumunda, engelli kullanıcılar için uygun yapıların oluşturulması sağlanacaktır. • Tüm faaliyetler, hem İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa (30 Haziran 2012 tarihli ve 27339 sayılı Resmî Gazete) ve ilgili yönetmeliklere hem de Dünya Bankası Grubu Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Yönergelerine uygun olarak yürütülecektir. • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yönetmeliklere uyumu sağlanacak, gerekli kontroller yapılacaktır. • İnşaat işleri başlamadan önce yapılacak tüm işler için İş Sağlığı ve Güvenliği Planı ile bir Risk Değerlendirme çalışması yapılacaktır. İlgili prosedürler ve planlar ("Acil Durum Planları" dahil) uygulanacaktır. • Hazırlanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Planında toplum sağlığı da işlenmelidir. Raporda, bina kullanıcıları ve yerel halkla iletişimi sağlayacak bir kişi ve pozisyon bu planda tanımlanacaktır. • Hem eğitimler hem de olaylar (kazalar, ölümler, kaybedilen zaman olayları, çevresel dökülmeler, yangın, salgın hastalık vb. önemli olaylar) kaydedilecektir. • İnşaat aşamaları süresince gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin, bilgilendirme toplantılarının, görüş/önerilerin, vs. sürekli kayıtları tutulacaktır. • Yüklenici ve altyüklenicilerinin hepsini kapsayacak şekilde: <ul style="list-style-type: none"> - Cebri/Zorla çalıştırma yapmayacağını, çocuk işçi ve sigortasız işçi çalıştırmayacağını, işçileri arasında herhangi bir ayrımcılık (yaş, cinsiyet, din, dil, ırk vs.), zor kullanma, kötü muamele, zorbalık, hakaret ve aşağılamada bulunmayacağı hususunda yazılı ve imzalı bir sosyal politika/yazılı bir taahhütname oluşturulacaktır. Bu dokümanda aynı zamanda tüm yüklenici çalışanlarının da birbirleri ile olan ilişki ve iletişimlerinde bu hususlara dikkat etmeleri gerektiği vurgulanacaktır. 	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici, Yapım İşlerinin ifası kaynaklı bulaşıcı hastalıkların (HIV virüsü gibi Cinsel Yolla Bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlar dahil) ve bulaşıcı olmayan hastalıkların yayılmasını önleyici tedbirler alacak, bu bağlamda bilhassa hassas ve kırılgan toplum gruplarının farklı oranlarda risk altında olduğu bilinciyle hareket edecektir. Sözleşmeyle bağlantılı geçici veya daimi işgücü hareketliliğinden kaynaklanabilecek bulaşıcı hastalıkların yayılımını önleyici ve etkilerini azaltıcı tedbirleri uygulayacaktır. 	
	<p style="text-align: center;">GÜVENLİK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama/inşaat işine başladığı andan itibaren inşaat sahası içerisinde bulunan görevli tüm personelin ve diğer bireylerin can ve mal güvenliğinden yüklenici sorumludur. • İnşaat işleri sırasında herhangi bir hasar meydana gelirse, Yüklenici; Yararlanıcı Kurum, İşveren ve/veya 3. tarafın oluşan zararlarının tamamını telafi edecektir. • Çalışmalar sırasında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın güvenlik kuralları ile Sağlık Bakanlığı'nın kuralları dikkate alınacaktır. İlgili kurallar, İşlerin yapımı sırasında genel referans olarak kullanılacaktır. • Yüklenici, sahada özel olarak kazalara karşı güvenlik ve koruma konusu ile ilgilenecek yetkili personel bulunduracak olup, bu personel Yüklenici'nin tüm işçileri ve işgücünün yanı sıra, Proje Müdürü, şantiyedeki işverenin personeli, ekipmanı, ofisleri ve diğer tesisleri ile ilgilenecektir. Bu kişi, bu iş için gereken özellikleri taşıyan, talimat verme yetkisi olan ve kazaların önlenmesine yönelik gerekli tüm önlemleri alabilecek bir kişi olacak ve Yüklenici tarafından özellikle bu amaç için kurulmuş bir ekibi oluşturacaktır. • Yüklenici imalat yapacağı mekanlardaki değiştirilmeyecek ve kullanılacak olan malzeme ve teçhizat ile imalatların zarar görmemesi için gerekli her türlü emniyet tedbirini almak zorundadır. • Gerekli sayıda bekçiden oluşan bir güvenlik ekibi Şehir Güvenlik Kuvvetleri ile iş birliği içinde olacak ve bütün kural ve onlardan alacağı talimatlara kesin olarak uymak suretiyle görevini yürütecektir. • Yüklenici, iş sahası için en az 1 (bir) adet gece bekçisi bulundurmak zorundadır. • Değişimi gerçekleştirilen makine ekipman ve sistemlerin hurdaları zarar verilmeden bina yönetimine teslim edilecektir. <ul style="list-style-type: none"> – Söz konusu makine, ekipman ve sistem parçaları bina yönetimi tarafından talep edilen alana (Bina içerisinde ve/veya bina çevresinde) yüklenici firma tarafından taşınacaktır. Taşıma ve teslim işlemleri teslim tutanağı ile gerçekleştirilecektir. Söz konusu tutanağın taraflarca imzalandığı tarih itibari ile hurdalara ilişkin sorumluluk bina yönetimine ait olacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici

	<p>HAVA KALİTESİ / EMİSYON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yıkıntı atıkları oluşması durumunda birinci kattan sonra moloz atma bacası kullanılacaktır. • Yıkıntı atıkları, İlçe Belediyesinin belirlemiş olduğu kontrollü alana gönderilecektir. • Yıkıntının/molozun tozunun azaltılması için üzerine su püskürtülecektir. • Proje sahasının çevresi (kaldırımlar, yollar) toz oluşumunun önlenmesi için molozdan arındırılacaktır. • İnşaat ya da atık malzemelerin yakılması kesinlikle yasaktır. • İnşaat sahasındaki inşaat makinaları uzun süre rölantide / bozta çalıştırılmayacaktır. • Malzeme taşınması gereken durumlarda kamyonların üstü örtülecek ve hız sınırı getirilecektir. • Kullanılacak tüm araçların egzoz emisyon izinleri olacak ve bütün araçların düzenli olarak bakımları yapılacak veya yapıldığı denetlenecektir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir <p>(Kontrolörlük faaliyetleri)</p>
	<p>DIŞ ORTAM GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • İnşaat işlemleri sırasında oluşan gürültü, izinlerde belirtilmiş olan zaman dilimleri ile sınırlı olacaktır. • İnşaat işlemleri mümkün olduğunca gündüz zaman dilimi ile sınırlı tutulacaktır. Faaliyetlerin akşam ve gece zaman diliminde gerçekleştirilmesi söz konusu olduğunda, akşam zaman dilimi için 65 dBA ve gece zaman dilimi için 60 dBA olan sınır değerler sağlanacak ve akşam ve gece çalışmalarına ilişkin İl Mahalli Çevre Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır. • İnşaat aşamasında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında jeneratör, hava kompresörü ve çalışan diğer mekanik ekipmanların motor kapakları kapalı tutulacak, ekipmanlar öğrenci alanlarından olabildiğince uzak noktalara yerleştirilecektir. • Şantiye faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü, LC max gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC'yi aşmayacaktır. • İnşaat aşamasında gürültü seviyesinin artış göstermesi durumunda, iş makinelerinin aynı anda çalıştırılmaması ya da mümkün olduğunca yeni model araçlar kullanılması gibi önlemler alınacaktır. • Şantiye sahası yakınında ikamet etmekte olan yerel halk inşaat süresince düzenli aralıklarla bilgilendirilecektir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir (Kontrolörlük faaliyetleri)

	ATIK YÖNETİMİ	<ul style="list-style-type: none"> • İnşaat faaliyetleri süresince tüm atık türleri kaynağında ayrı toplanacak ve belirlenen geçici atık depolama alanında depolanacaktır. • İnşaat sürecinde ortaya çıkan atıkların tehlikeli atık grubuna dahil olması durumunda, depolanma ve bertarafı tehlikeli atıklar kategorisine göre gerçekleştirilecektir. • Yüklenici firma ile yararlanıcı kurum arasında protokol imzalanması durumunda mevcut atık yönetim sistemini kullanılabilir. Ancak yapılan protokol ile yüklenici kendi atıklarından kaynaklanan maliyetleri karşılamakla yükümlü olacaktır. • Sahada genel çöp (evsel atıklar) kimyasal atıklardan ayrıştırılacak ve uygun konteynerlerde saklanacaktır. • İnşaat atıkları lisanslı taşıyıcılar tarafından düzenli olarak toplanacak ve bertaraf edilecektir. • Atık bertarafı ve geri dönüşümüne ait dokümanlar düzenli olarak kayıt altında tutulacaktır. Bu kayıtların tutulması için Atık Kayıt Bilgi Formu hazırlanacaktır. • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevrimiçi programlarında Entegre Çevre Bilgi Sistemi (E-ÇBS) üzerinden atık yönetim uygulaması kullanılarak tehlikeli atıkların lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi sağlanacaktır. • Uygun durumlarda, tehlikeli atıklar dışındaki atıklar, ilgili yönetmeliklere uygun olarak yeniden kullanabilecek ya da geri dönüşümleri sağlanabilecektir. • Söküm faaliyetleri sonucunda binaya ait zimmetli malzeme oluşması durumunda bina yönetimine çıkan malzemenin teslim edildiğine dair belge alınacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir (Kontrolörlük faaliyetleri)
	EVSEL ATIKLAR	<ul style="list-style-type: none"> • Oluşacak evsel nitelikli atıklar kaynağında ayrıştırılacak (plastik, cam, kağıt, vb.) ve değerlendirilebilir olanların geri dönüşümü sağlanacaktır. • Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar, ağzı kapalı sıhhi çöp bidonlarında biriktirilecek, İlçe Belediyesinin katı atık toplama sistemi aracılığıyla düzenli depolama sahalarına gönderilecektir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir (Kontrolörlük faaliyetleri)

	ATIK YAĞLAR	<ul style="list-style-type: none"> • Şantiyedeki çalışmalardan kaynaklanan farklı kategorilerde yağ türleri olması durumunda, bu yağlar ayrıca depolanacaktır. • Atık yağların depolandığı konteynerlerin ağzı kapalı tutulacak ve yağmur suyundan korunacaktır. • Taşma ve dökülmelerine karşı, sahada döküntü kitleri bulundurulacaktır. • Atık yağlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevrimiçi programı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (E-ÇBS) üzerinden atık yönetimi uygulaması kullanılarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir. • Orta ve büyük ölçekli çevresel kazaların oluşması halinde, kaza araştırması yapılacak ve raporlanacaktır. • Sağlık ve güvenlik olayları, tedavi gerektiren kazalar, yaralanmalar ve tüm ölümlere ilişkin durumlar 3 iş günü içinde ÇŞİDB'ye bildirilecek ve 30 işgünü içinde kök sebep analizi ile birlikte kaza raporu ÇŞİDB'ye gönderilecektir. • Daha küçük çaplı kazalar (iş günü kaybı olmayan, ramak kalalar, vb.) ise ÇSYP izleme raporlarında belirtilecektir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir (Kontrolörlük faaliyetleri)
	ATIK PİLLER / AKÜLER	<ul style="list-style-type: none"> • Atık piller diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak ve yetkilendirilmiş kuruluşlara teslim edilecek ve geri dönüşümü sağlanacaktır. • Atık pil ve akümülatörler, Belediye sınırları içinde bulunan atık pil ve akümülatör bertaraf tesislerine, yetkili taşıma firmaları aracılığıyla ulaştırılacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir (Kontrolörlük faaliyetleri)
	ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER	<ul style="list-style-type: none"> • İnşaat faaliyetleri süresince araç lastiklerinin değiştirilmesi gerektiği durumlarda; eski lastikler, lastik dağıtımını ve satışı yapan işletme ve taşıma lisanslı araçlar aracılığıyla bertaraf edilecektir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir (Kontrolörlük faaliyetleri)
	İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI	<ul style="list-style-type: none"> • Atıklar kaynağında en aza indirilecektir. Diğer atıklar ile bina ıslahından oluşan yıkıntı atıkları karıştırılmayacaktır. • İnşaat/yıkıntı atıklarının oluşması durumunda geri kazanılması ve özellikle alt yapı malzemesi olarak yeniden değerlendirilmesi öncelikli olarak değerlendirilecektir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir (Kontrolörlük faaliyetleri)

	ASBEST YÖNETİMİ	<ul style="list-style-type: none"> • Proje sahasında asbest bulunması durumunda, bu madde açıkça tehlikeli madde olarak belirtilecektir. • Proje sahasında asbest olması durumunda, asbest etkisini en az düzeye indirmek için uygun şekilde muhafaza edilecek ve sızdırmazlığı sağlanacaktır. • Asbestin sökülmesinin gerektiği durumlarda, söküme öncesinde asbest tozunun en az düzeyde tutulması için ıslatma maddesi kullanılacaktır. • Asbest materyalinin geçici süre ile saklanması gerektiği durumlarda, atıklar güvenli bir şekilde kapalı konteynerler içinde tutulmalı ve uygun şekilde etiketlenecektir. • Sökülen Asbest, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevrimiçi programı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (E-ÇBS) üzerinden atık yönetimi uygulaması kullanılarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir. Asbest ile ilgili prosedür Ek 5'te bulunmaktadır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir (Kontrolörlük faaliyetleri)
	TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ	<ul style="list-style-type: none"> • Proje sahasında tehlikeli atıkların geçici olarak depolanması durumunda; atıklar sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynerlerde ve alan içerisinde muhafaza edilecek, konteynerlerin üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer verilecek ve depolanan maddenin atık kodu, miktarı, içeriği, özellikleri, koruma koşulları ve depolama tarihi konteynerler üzerinde belirtilecektir. • Zararlı maddelerin saklandığı konteynerler, toprağa dökülme ve sızıntıyı önlemek için sızdırmaz beton alanlara yerleştirilecektir. • Tehlikeli atıklar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevrimiçi programı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (E-ÇBS) üzerinden atık yönetimi uygulaması kullanılarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir. • Zehirli içeriğe sahip boyalar, eritici madde (solvent) ya da kurşun bazı kimyasallar kullanılmayacaktır. • Tehlikeli atıkların yönetimi Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilecektir. • Şantiye sahasında oluşması muhtemel tehlikeli kimyasal ve atıkların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevrimiçi programı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (E-ÇBS) üzerinden atık yönetimi uygulaması kullanılarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir (Kontrolörlük faaliyetleri)

	<p>ŞİKAYET/GÖRÜŞ & ÖNERİLER</p>	<ul style="list-style-type: none"> • İnşaat faaliyetlerinden kaynaklı şikâyet/görüş/önerileri saha ölçüğünde inşaat Yüklenicisinin sorumlu çalışanı Ek 2 ve 3”te verilen formlar aracılığı ile toplayacak, kayıt altına alacak ve idareye iletecektir. • İnşaat faaliyetleri sırasında paydaşlardan gelebilecek her türlü sözlü şikâyet/görüş/öneri de Ek-2 ve Ek-3’te verilmiş olan formlar kullanılarak kayıt altına alınacak ve takip edilecektir. • Yüklenicinin saha sorumlusuna Şikâyet ve Çözüm Mekanizmasının işleyişine dair eğitim verilecektir. • Proje kapsamında toplanan şikayet/görüş/öneriler için 15 iş günü içerisinde düzeltici faaliyetlerde bulunulacak olup, çözüm süresinin 15 günden fazla olması durumunda (çözüm süresi en fazla 30 takvim günü sürecektir) bu husus yüklenici/PUB ile şikayetçi arasında kararlaştırılmalıdır. Sürecin sonunda başvuru sahibi, talebin kapatıldığı konusunda bilgilendirilecektir. • Cinsiyet temelli şiddet, cinsel sömürü ve taciz konusunda gelecek şikayetlerde misilleme ihtimali dikkate alınarak gizlilik ilkesine göre işlem yapılacaktır. • Yüklenici, Şikayet Çözüm Mekanizması ile ilgili tüm çalışmalarda KABEV Projesi Şikayet Çözüm Mekanizması Prosedürüne uygun işlem yapacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> • İdare • Yüklenici • Müşavir (Kontrolörlük faaliyetleri)
--	--	--	---

	<p>TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ / TRAFİK VE YAYA GÜVENLİĞİ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • İnşaat alanları, olası kazaları önlemek için çitler ve uyarı işaretleri ile çevrili olacaktır. • Çalışma yöntem ve saatleri, bina kullanıcılarının inşaat faaliyetlerinden en az seviyede etkileneceği şekilde planlanacaktır. • İnşaat faaliyetleri nedeni ile uzun ya da kısa vadede elektrik, su, doğalgaz kesintisi olacak ise, bu durumda bina kullanıcılarına kesintiden en az 3 (üç) gün önce bilgilendirilme yapılacaktır. • İnşaat ekipmanlarının inşaat alanında güvenliği sağlanacaktır. • İnşaat alanı yakın çevresinde varsa hassas alıcılar (okul, kreş, cami, vs.) için inşaat risklerinin yer aldığı bilgilendirici broşürler hazırlanıp dağıtılacaktır. • İnşaat süresince çalışacak olan her türlü aracın belirlenen hız limitine uymaları sağlanacaktır. • Proje sahasının etrafı ve yakınları trafik işaretleri ve uyarı levhalarıyla düzenlenecektir. • Proje sahasının görünürlüğü sağlanacaktır. • Saha içindeki yayalar yolları ve araç geçiş yolları birbirinden ayrılacaktır. Bu yollar trafik planına işlenecektir. • Yerel halk, bina ziyaretçileri ve kullanıcıları, olası tehlikeler ve riskler konusunda gerek uyarı levhaları ile gerek bilgilendirme konuşmaları ile bilgilendirilecektir. • Halk, alanlarda Covid-19 hususunda alınan tedbirler de dahil olmak üzere yapılacak çalışmalarla ilgili uygun medya kullanılarak ve/veya halkın erişebileceği alanlarda (çalışma sahaları da dahil olmak üzere) bilgilendirilecektir. • Saha içindeki yaya yolları ve araç geçiş yolları birbirinden ayrılacaktır. Bu yollar trafik planına işlenecektir. • Bölge trafiğini etkileyecek faaliyetler, mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu saatler göz önüne alınarak planlanacaktır. Projede görev alacak tüm sürücüler, yol güvenliği, hız limitleri, proje süresince uyulması gereken trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken koşullar konusunda bilgilendirilecektir. • Proje kapsamında kullanılacak tüm araçların ağırlıkları, ilgili mevzuatta verilen limitleri aşmayacaktır. • Sahada tehlikeli kimyasal ya da atık depolanması durumunda, bu atıkların transferi halk sağlığına tehdit oluşturmayacak şekilde lisanslı taşıyıcılar tarafından gerçekleştirilecektir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir (Kontrolörlük faaliyetleri)
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">• Özel yükler, yetkili mercilerle anlaşarak hazırlanmış rotaları kullanacaklardır. Belirtilen rotalar, yollarda trafiğin yoğunlaşmasını engelleyecek şekilde programlanacak ve olası rahatsızlığın engellenmesi için önceden yayımlanacaktır.• Trafik konusundaki tüm organizasyon, yetkili kurumlar ile görüşülecek ve planlanacaktır.	
--	--	--	--

	DİĞER HUSUSLAR	<ul style="list-style-type: none"> • Çalışanların iş aralarında dinlenebilmeleri için uygun ortam yüklenici firma tarafından (<i>çalışan sayısı, dinlenme saatleri</i>) sağlanacaktır. Söz konusu dinlenme alanı İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 17.07.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28710) şartlarını karşılamak zorundadır. • Çalışanların; yemek yeme yerleri için gerekli olan düzenleme yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. (<i>Yemek saati, çalışan sayısı</i>). Bina yönetiminin yazılı izni ve onayı alınması halinde idarenin olanaklarından faydalanılabilecektir. • Çalışanlar için soyunma odaları (<i>kilitlenebilir</i>) yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bina yönetiminin yazılı izni ve onayı alınması halinde idarenin olanaklarından faydalanılabilecektir. Çalışanların bu alanlarda kıymetli eşyalarını bulundurmaması, söz konusu alanda yaşanabilecek hırsızlık vb. olumsuzluklara ilişkin bina yönetiminin hiçbir sorumluluk taşımadığı yüklenici firma tarafından çalışanlara bildirilecektir. Söz konusu husus uyarı levhaları ile de afişe edilecektir. • Saha mobilizasyonunda ofis, dinlenme alanı,WC vb. kullanımlar için gerekli elektrik ve suyun bina altyapısından karşılanması durumunda süzme sayaç kullanılacak ve kullanım bedeli için yararlanıcı kurum ile mansuplaşılacaktır. • Çalışanların tuvalet ihtiyaçları bina yönetiminin yazılı izni ve onayı alınması halinde bina altyapılarından karşılanacaktır. Mevcut alt yapının kullanılamaması durumunda işçilerin kullanımı için WC konteynerleri, yüklenici tarafından ayarlanacak, konteynerler hijyen için tüm malzemeleri içerecektir. Ancak; <ul style="list-style-type: none"> – Çalışanlar, binada kendilerine izin verilen/tahsis edilen tuvaletleri kullanabilirler. Yüklenici firma; çalışan sayısı doğrultusunda izin verilen/tahsis edilen tuvaletleri çalışanlarına bildirecektir. Söz konusu kısıtlamaya ilişkin takip ve kontrol yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır. – Söz konusu tuvaletlerin, hijyen kurallarına uygun biçimde kullanılması konusunda yüklenici firma çalışanlarını uyarmak zorundadır. Söz konusu kuralların dışında kullanım tespit edilirse temizlik sorumluluğu yüklenici firmaya ait olacaktır. • Yüklenici firma çalışanların rahatlıkla araştırılabilmesi için proje adını gösterir iş kıyafetleri sağlayacaktır. Genel kıyafet tasarımı bu rapor içinde iş kıyafeti bölümünde belirtilmiştir. • Çalışanların binaya girişi, çalışma alanlarına erişimi yüklenici tarafından belirlenen alanlar ile sınırlı olacaktır. Bu suretle genel bina işleyişinin genel hatları ile korunması amaçlanmaktadır. Yüklenici firmalar, çalışanlarını bu konuda takip 	<ul style="list-style-type: none"> • İdare • Yüklenici • Müşavir (Kontrolörlük faaliyetleri)
--	-----------------------	--	---

		<p>etmek, kurallara uygun hareket etmeyen çalışanlarını uyarmak ile yükümlü olacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Çalışanların herhangi bir nedenle bina kullanıcıları ile tartışmaya girmesi kesinlikle yasaktır. Bireysel ya da faaliyetler ile ilgili problemlerin yaşanması halinde çalışan durumu derhal yöneticisine bildirecektir (<i>Sorumlu yönetici ve iletişim bilgileri bütün çalışanlara yüklenici firma tarafından bildirilecektir.</i>). Yüklenici firma bu tip durumları kayıt altına alacak ve müşavire ileticektir. Bu sürece ilişkin her türlü karar/aksiyon bina yönetimi bilgisi ve onayı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. • Olması halinde gece çalışmaları için bina yönetiminden onay alınması zoruridir. • Çalışma planı ve olması halinde söz konusu plandan yaşanacak sapmalar bina yönetimine bildirilecektir. <ul style="list-style-type: none"> – Aydınlatma elemanı değişimi gibi bina genelini etkileyen çalışmalarda planlama, bina yönetimi ile birlikte faaliyetlerinin/hizmetlerin devamlılığı göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Özellikle bu tip çalışmalarda; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bina kullanıcılarının çalışma alanlarına erişimini engelleyecek uygun kısıtlayıcılar (<i>bariyerler, uyarı işaretlemleri vb.</i>) yüklenici firma tarafından temin edilecek ve disiplinli şekilde kullanılması sağlanacaktır. ▪ Gürültünün engellenmesi için gereken hassasiyet (yapım metodu, ekipman kullanımı, çalışanlar arası haberleşme vb.) yüklenici firma tarafından gösterilecektir. ▪ Özellikle hassas alanlarda ve yakınlarında yapılan çalışmalar (Yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler vb.) bina yönetimi izinleri doğrultusunda yüklenici firma tarafından görevlendirilen sorumlu yöneticilerin gözetiminde gerçekleştirilecektir. • Müşavir Firma , bu proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ve çalışma süreleri konusunda bina çalışanlarını ve ziyaretçileri bilgilendirmelidir. Özellikle çalışmalardan etkilenecek personellere çalışma planları aktarılmalıdır. Bu çerçevede bina yönetimi; <ul style="list-style-type: none"> – Teknik personelleri detaylı şekilde bilgilendirmeli ve yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen çalışmaların etkin şekilde takip edilmesi sağlanmalıdır. 	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Yenilenen, yeniden tesis edilen bütün sistemlerin testleri ve işletmeye alınması, söz konusu teknik personellerin gözetiminde gerçekleştirilmelidir. - Bu projenin amacına uygun olarak; yenilenen, yeniden tesis edilen bütün sistemlerin tamamına ilişkin yüklenici firma, bina teknik personellerine eğitim verecektir. Bu suretle söz konusu sistemlerin periyodik bakım ve kontrolleri (<i>dış hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilecek çalışmalar dahil</i>), işletmeye alma ve işletmeden çıkarma, cihaz/sistem parametrelerinin değiştirilmesi ve yüksek verim oranlarında çalıştırılmalarına ilişkin yeterli seviyede bilgi aktarımı sağlanacaktır. Söz konusu eğitimlere, atanmış/atanacak enerji yöneticisi katılımı sağlanacaktır. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Enerji Yöneticisi; yenilenen/yeniden tesisi edilen cihaz/sistemlerin yüksek verim oranlarından işletilmesinden, bakım ve kontrollerinin uygun biçimde gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluğun çalışmalar öncesinde Bina Yönetimi tarafından kendisine bildirilmesi, sürece bu sorumluluk bilinci ile katılımı sağlanacaktır. • EN ISO 50001 enerji yönetim sisteminin, bina enerji takip ve otomasyon sistem kurulumu, bizzat Enerji Yöneticisi gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Bu husus Bina Yönetimi tarafında, atanmış/atanacak Enerji Yöneticisine bildirilecektir. • Yüklenici firma öneri ve şikayetlerin toplanması için bu rapor içinde belirtilen iletişim bilgilerini, bina dışına ve içine (<i>her kat için en az bir tane</i>) tahsis edilen bilgilendirme levhaları ile duyuracaktır. Yüklenici firmalar; çalışanların belirlenmesi esnasında söz konusu alana yakın mesafelerde yaşayan bireylere öncelik tanyacaktır (Mesleki yeterlilik şartlarının karşılanması halinde). Bu suretle gerçekleştirilen çalışmaların yerel halk tarafından tanınması anlaşılması, aynı zamanda yerel ekonominin desteklenmesi sağlanacaktır. • Cinsel İstismar Suçu ile karşılaşılması halinde, bu suçtan sağ çıkanın onayı ve bilgisi dahilinde, derhal yasal prosedür (durumun polise aktarılması, asliye ceza mahkemesi sürecinin başlatılması) devreye girecektir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde, aynı gün içerisinde, Proje Uygulama Birimine bilgi verilecektir. 	
--	--	--	--

7. ÇEVRESEL VE SOSYAL İZLEME PLANI

Tablo 8 Çevresel ve Sosyal İzleme Planı

NE Parametre izlenecek mi?	NEREDE Parametre izlenecek mi?	NASIL Parametre izlenecek mi?	NE ZAMAN Frekansını tanımlayın / veya sürekli mi?	NEDEN Parametre izleniyor mu?	MALİYET Proje bütçesine dahil değilse	KİM İzlemeden sorumlu?
Bilgilendirme	<ul style="list-style-type: none"> Proje sahası yakınındaki yerleşim alanları 	<ul style="list-style-type: none"> Toplantı kayıtları/tutanakları Toplantılara katılan dezavantajlı birey sayısı Yapılan toplantı sayısı Dağıtılan tanıtım/bilgilendirme görseli sayısı 	<ul style="list-style-type: none"> Proje ömrü boyunca 	<ul style="list-style-type: none"> Projenin sosyal ve çevresel etkilerinin alınan tedbirlerle minimize edileceği bilgisinin projeden etkilenen bina çalışanları, faydalanıcılarla ve ilgili özel ve tüzel kişilerle paylaşılması ve varsa projenin daha iyi yürütülmesini sağlayacak önerilerinin alınması 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> İdare Yüklenici
Dokümantasyon	<ul style="list-style-type: none"> Proje sahası 	<ul style="list-style-type: none"> Saha denetimi Kayıtların kontrolü 	<ul style="list-style-type: none"> Proje ömrü boyunca / Toplantılar ve saha denetimleri sırasında ve ihtiyaç oldukça (kaza gibi durumlar olması halinde) 	<ul style="list-style-type: none"> Ulusal mevzuat ve tetiklenen DB politikaları gereklilikleri doğrultusunda projenin yönetilmesinin takibi 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici Müşavir
İş Sağlığı ve Güvenliği	<ul style="list-style-type: none"> Proje sahası Proje sahası yakınındaki yerleşim alanları 	<ul style="list-style-type: none"> Saha denetimleri 	<ul style="list-style-type: none"> Proje ömrü boyunca / Günlük 	<ul style="list-style-type: none"> İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici Müşavir
Hava Kalitesi	<ul style="list-style-type: none"> Proje sahası Proje sahası yakınındaki yerleşim alanları 	<ul style="list-style-type: none"> Saha denetimleri Şikâyet durumunda gerçekleştirilecek ölçümler 	<ul style="list-style-type: none"> Proje ömrü boyunca Şikâyet olması durumunda 	<ul style="list-style-type: none"> Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici Müşavir

Gürültü	<ul style="list-style-type: none"> Proje sahası Proje sahası yakınındaki yerleşim alanları 	<ul style="list-style-type: none"> Gürültü ölçüm cihazı ile en yakın hassas alıcı noktalarda izleme Saha denetimleri Şikâyet durumunda gerçekleştirilecek ölçümler 	<ul style="list-style-type: none"> Proje ömrü boyunca Şikâyet olması durumunda 	<ul style="list-style-type: none"> Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici Müşavir
Atık Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> Proje sahası 	<ul style="list-style-type: none"> Atık kayıtları Saha denetimi 	<ul style="list-style-type: none"> Proje ömrü boyunca / Günlük 	<ul style="list-style-type: none"> Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Atık Yönetimi Yönetmeliği 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici Müşavir
Evsel Atıklar	<ul style="list-style-type: none"> Proje sahası 	<ul style="list-style-type: none"> Atık kayıtları Saha denetimi 	<ul style="list-style-type: none"> Proje ömrü boyunca / Günlük 	<ul style="list-style-type: none"> Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Atık Yönetimi Yönetmeliği 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici Müşavir
Atık Yağlar	<ul style="list-style-type: none"> Proje sahası 	<ul style="list-style-type: none"> Atık kayıtları Saha denetimi 	<ul style="list-style-type: none"> Proje ömrü boyunca / Günlük 	<ul style="list-style-type: none"> Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici Müşavir
Atık Pil ve Akümülatör	<ul style="list-style-type: none"> Proje sahası 	<ul style="list-style-type: none"> Atık kayıtları Saha denetimi 	<ul style="list-style-type: none"> Proje ömrü boyunca / Günlük 	<ul style="list-style-type: none"> Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici Müşavir
Ömrünü Tamamlamış Lastikler	<ul style="list-style-type: none"> Proje sahası 	<ul style="list-style-type: none"> Atık kayıtları Saha denetimi 	<ul style="list-style-type: none"> Proje ömrü boyunca / Günlük 	<ul style="list-style-type: none"> Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici Müşavir
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları	<ul style="list-style-type: none"> Proje sahası 	<ul style="list-style-type: none"> Taşıma kayıtları Saha denetimi 	<ul style="list-style-type: none"> Proje ömrü boyunca / Günlük 	<ul style="list-style-type: none"> Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici Müşavir
Asbest Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> Proje sahası Proje sahası yakınındaki yerleşim alanları 	<ul style="list-style-type: none"> Saha denetimi Doküman kayıtlarının incelenmesi 	<ul style="list-style-type: none"> Tespit edilmesi halinde 	<ul style="list-style-type: none"> Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici Asbest Söküm Uzmanı Müşavir
Tehlikeli Atık Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> Proje sahası 	<ul style="list-style-type: none"> Atık kayıtları Saha denetimi 	<ul style="list-style-type: none"> Proje ömrü boyunca / Günlük 	<ul style="list-style-type: none"> Atık Yönetimi Yönetmeliği 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> Yüklenici Müşavir

Şikâyet Çözüm Mekanizması	<ul style="list-style-type: none"> • Proje sahası • Proje sahası yakınındaki yerleşim alanları 	<ul style="list-style-type: none"> • Şikâyet ve Öneri Formları • Şikâyet Kapama formları • Toplam şikâyet sayısı (beklemede olan/çözömlenen ayrımı yapılmış şekilde) • Gelen şikâyet sayısı • Çözömlenen şikâyet sayısı 	<ul style="list-style-type: none"> • Proje ömrü boyunca/haftalık 	<ul style="list-style-type: none"> • ÇSYP • Projenin Şikâyet Çözüm Mekanizması'nın işlerliliğinin sağlanması ve takibi • Proje paydaşlarının, bina kullanıcı, faydalanıcı ve yönetiminin proje faaliyetleri konusunda şikâyet/görüş/önerilerini gündeme getirebilmesi, projeye katkıda bulunması ve projeden en üst düzeyde faydalanabilmesinin sağlanması 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> • İdare • Müşavir
Çevre ve Sosyal Eğitimler	<ul style="list-style-type: none"> • Proje Sahası 	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim kayıtları 	<ul style="list-style-type: none"> • Proje ömrü boyunca/haftalık 	<ul style="list-style-type: none"> • Ulusal Mevzuat • ÇSYP 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Müşavir
İnşaat faaliyetlerinin trafik ve yayalar için oluşturduğu doğrudan ve dolaylı tehlikeleri	<ul style="list-style-type: none"> • Proje Sahası 	<ul style="list-style-type: none"> • Saha denetimi 	<ul style="list-style-type: none"> • Proje ömrü boyunca / • Saha içi iş makineleri kullanıldıkça ve dışarıdan malzeme ve insan taşımacılığı yapıldıkça 	<ul style="list-style-type: none"> • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir
Şantiye Sahasına Giriş Güvenlik Çiti Koruma Bandı	<ul style="list-style-type: none"> • Proje sahası • Proje sahası yakınındaki yerleşim alanları 	<ul style="list-style-type: none"> • Saha denetimi 	<ul style="list-style-type: none"> • Proje ömrü boyunca / Günlük 	<ul style="list-style-type: none"> • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici sorumluluğundadır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüklenici • Müşavir

8. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ÇSYP kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalar ve bu çalışmalardan sorumlu olan taraflar Tablo 9’da sunulmaktadır.

Tablo 9 Görev ve Sorumluluklar

Sorumlu Taraf	Sorumluluk
Dünya Bankası (DB)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hazırlanan ilk grup ÇSYP’nin gözden geçirilmesi ve ilgili kişi/birimlere geri bildirim yapılması ▪ Proje’nin DB Operasyonları ile örtüştüğünden emin olmak için destek misyonları gerçekleştirilmesi
ÇŞİDB / PUB / İdare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Her bir proje sahası için hem ulusal yönetmelikler hem de DB tedbir politikaları açısından değerlendirme yapılması ▪ Proje özelinde hazırlanan ÇSYP’lerin hem ulusal yönetmelikler hem de DB tedbir politikalarına uygunluğunun denetlenmesi ve uygunluğunun sağlanması. ▪ Hazırlanan ÇSYP’lerin ilgili kontrollerden sonra DB görüşüne sunulması ▪ Şikâyet Çözüm Mekanizmasının kurulması ▪ Proje bilgilendirme toplantılarının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi ▪ Çevresel ve Sosyal İzleme Programı için uygun uzmanın istihdam edilmesi ▪ Müşavir ve yüklenicilerin yönlendirilmesi ▪ Proje uygulamasına ilişkin çevresel ve sosyal konuların düzenli ilerleme raporlarıyla özetlenmesi ve DB’ye sunulması ▪ Proje uygulamasının çevresel ve sosyal tedbir politikaları açısından değerlendirilmesi kapsamında DB’nin denetleme misyonları için koordinasyon ve irtibatın sağlanması ▪ Yüklenicinin ÇSYP uygulamasının denetlenmesi ve genel proje denetiminin parçası olarak ihtiyaç duyulan performans, öneri ve ileriki dönem faaliyetlerinin belgelendirilmesi ▪ ÇSYP’ye uyulmaması durumunda yüklenicinin doğru uygulamayı gerçekleştirmesinin sağlanması ve konu ile ilgili olarak DB’nin konu hakkında bilgilendirilmesi ▪ Gerekli yasal izinlerin alınması için arsa tapularının, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/shahısların yetki belgelerinin temin edilmesi ▪ Enerji şirketlerine başvuru sırasında talep edilen ÇED’den muaf belgesinin temin edilmesi
Müşavir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proje başlamadan önce ön saha değerlendirmesinin yapılması ▪ Projeye özgü ÇSYP ve İş sağlığı Güvenliği Planı’nın hazırlanması ▪ ÇSYP’de yüklenicinin sorumluluğu olarak tanımlanan faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ▪ Bakanlıkça kurulan Şikâyet Çözüm Mekanizmasının işletilmesinin sağlanması ▪ ÇŞİDB’ye proje ve ÇSYP süreçleri hakkında raporlarla geri bildirimde bulunmak ▪ Fotovoltaik panel kurulumu için enerji dağıtım şirketine başvuru yapılması
Yüklenici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ İhale dokümanlarına eklenen ve Müşavirce hazırlanmış olan ÇSYP ve İSG Planı ile ilgili kanun, yönetmelikler ve düzenlemelerin uygulanması ▪ Sahaya özel hazırlanmış ÇSYP’nin sahada eksiksiz yönetimi ve takibini sağlamak üzere, sahaya deneyimli bir Çevre, Sosyal ve İSG Sorumlusu atamak. ▪ Sahada ÇSYP’lerin ve İSG Planının uygulanması sürecinde gerektiğinde Müşavir ile birlikte ÇSYP’nin İSG Planının içeriğinde güncelleme yapılması ▪ Projeye özgü hazırlanan ÇSYP’lerde tanımlanan saha faaliyetlerinin düzenli aralıklarla (günlük, aylık vb.) izlenmesi ▪ Bakanlıkça kurulan Şikâyet Çözüm Mekanizmasının, Şikâyet Çözüm Mekanizması Prosedüre uygun olarak, işletilmesinin sağlanması ▪ Gerekli görüldüğü durumlarda Rastlantisal Bulgu Prosedürünün hazırlanması ▪ ÇŞİDB’nin incelemesi için ÇSYP ilerleme raporlarının hazırlanması ▪ Cihaz seçimi yapıldıktan sonra yetkili enerji dağıtım şirketine ve yerel gaz dağıtım şirketine başvuruda bulunacaktır.

9. RAPORLAMA


Projenin uygulama aşamasında gerçekleştirilmesi gereken raporlama süreçleri ve bu süreçlerin gereklilikleri Tablo 10'da sunulmaktadır.

Tablo 10 Raporlama Sürecinin Gereklilikleri ve Rol Dağılımı

Sorumlu Taraf	Raporlama Süreci Gerekliliği
YİGM (İdare)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 aylık Proje İlerleme Raporunun hazırlanması ve DB'ye sunulması ▪ Şikâyet Çözüm Mekanizmasının işleyişi hakkında DB'nin aylık olarak bilgilendirilmesi.
Müşavir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ İdarenin gözden geçirilmesi için ÇSYP uygulama sonuç raporlarının hazırlanması ▪ Aylık olarak ÇSYP ilerleme raporlarının hazırlanması ve İdare'ye sunulması ▪ Haftalık olarak ŞÇM raporlarının hazırlanması ve İdare'ye sunulması
Yüklenici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aylık olarak ÇSYP ilerleme raporlarının hazırlanması ve Müşavir'in onayına sunulması ▪ Haftalık olarak ŞÇM raporlarının hazırlanması ve Müşavirin Proje Müdürüne sunulması

10. EKLER

EK 1 - SAHA FOTOĞRAFLARI

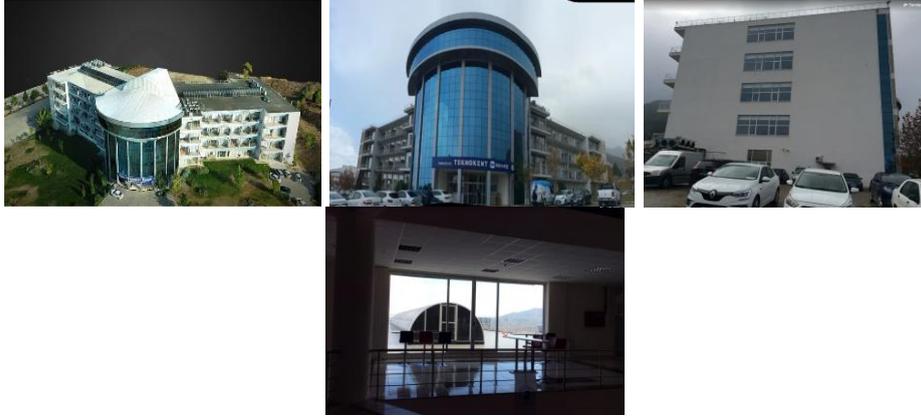

Fotoğraf 1 Teknopark Genel Görşelleri_Örnek Bina



Fotoğraf 2 Ömer Halisdemir Spor Salonu Genel Görşelleri_Örnek Bina 2



Fotoğraf 3 Çatı Görşelleri



Fotoğraf 4 Isıtma Merkezi Kazan Görşelleri



Fotoğraf 5 Ömer Halisdemir Spor Salonu Kazan Görselleri

EK 2 – ŞİKÂYET VE ÖNERİ FORMU

Müşavir seviyesi şikayetler için öncelikle internet tarayıcınıza adresi yazın : <https://portal.atlascert.com.tr/login>
Bu işlem üyelik gerektirmez. Ardından kayıt için Öneri/Şikayet/ Ramakkala butonuna tıklayın.

ATLASCert®

Portal Login

email

fehinyasar@atlascert.com.tr

Password



Ben robot değilim



güvenli giriş için


Giriş

Üyelik adı / Password is not required!

Suggestion / Complaint /
Near-Miss



Kayıt için Öneri/Şikayet/ Ramakkala butonuna tıklayın.



Proje adını yazın.

Şikayet, Öneri, Ramakkala Form

Öneri Şikayet Ramakkala

Kurum / Proje

Bildirimizinizi

Görsel (Opsiyonel)

Choose Files No file chosen

I'm not a robot

Gönder

Uyarılar

- Ahlak kurallarına uygun olmayan içerikler değerlendirilmeye alınmadan silinecektir.
- Bildirimlerinizi açık ve net ifadeler kullanarak belirtiniz.

Bildirimimizi buraya ekleyin. Eğer gerekiyse fotoğraf ve dosya da ekleyebilirsiniz.

Şikayet, Öneri, Ramakkala Form

Öneri Şikayet Ramakkala

Kurum / Proje

Bildirimizinizi

Görsel (Opsiyonel)

Choose Files No file chosen

I'm not a robot

Gönder

Uyarılar

- Ahlak kurallarına uygun olmayan içerikler değerlendirilmeye alınmadan silinecektir.
- Bildirimlerinizi açık ve net ifadeler kullanarak belirtiniz.

Kutuya tıklayıp ardından send butonuna tıklayın.

ATLAScert Suggestion / Complaint / Near-Miss Form

Suggestion Complaint Near Miss

Institution / Project
Misaş Georgia

Your Notice
Text

File(s) (Optional)
[Dosyaları Seç] [Dosya seçmedi]

Ben robot değilim

Send

Warnings

- Content that does not comply with the moral rules will be deleted without being evaluated.
- Bildirimleri açık ve net ifadeler kullanarak belirtiniz.

Kaydınız alınmıştır. Ekrandaki takip numarasını lütfen kopyalayın ve kaybetmeyin.

ATLAScert Suggestion / Complaint / Near-Miss

Tracking Number

ZFXLQG Copy

You can find out the decisions made regarding your notification with the tracking number.

OK

Kayıt için Öneri/Şikayet/ Ramakkala ile ilgili kaydınızın durumunu kontrol etmek için takip numaranızı yazın ve send butonuna tıklayın.



Öneri/Şikayet/ Ramakkala kaydınız ile ilgili süreç ve sonuçlar bu ekranda gösterilir.

ŞİKÂyet VE ÖNERİ FORMU	
Referans No	
Tam Adı	
Lütfen şikâyet/öneri/görüşünüz ile ilgili olarak sizinle nasıl iletişim kurulmasını istediğinizi işaretleyin	E-posta (lütfen e-posta adresinizi belirtiniz) _____@_____
	Telefon (lütfen sizinle iletişim kurulmasını istediğiniz telefon numaranızı belirtiniz) (__) _____
	Posta (lütfen sizinle iletişim kurulmasını istediğiniz posta adresinizi belirtiniz) _____
İl/İlçe/Mahalle	
Tarih	
Şikâyet Kategorisi	
1. Projeden etkilenen varlıklar / mülkler hakkında	
2. Altyapıda oluşan kesintiler (elektrik, su, internet, doğal gaz kesintisi)	
3. Gelir kaynaklarının azalması veya tamamen kaybedilmesi üzerine (Hastane kantini vs.)	
4. İstihdam kaynaklı (Yüklenici çalışanı)	
5. Çevre ile ilgili konularda (Çöp, toz, yağlı zemin, vs.)	
6. Sağlık ve Güvenlik tehlikesi (Güvensiz inşaat faaliyeti)	
7. Trafik, ulaşım ve diğer riskler hakkında	
8. Diğer (Lütfen belirtin):	
Şikâyetin Tanımı Ne oldu? Ne zaman oldu? Nerede oldu? Sorunun sonucu nedir?	
Sorunun çözülmesi konusunda ne tür aksiyonlar alınmasını ekliyor/öneriyorsunuz?	
<i>İsim ve iletişim bilgilerinin paylaşılması zorunlu olmamakla birlikte, şikâyet/görüş/önerileriniz ile ilgili geri bildirim sürecinde bilgi eksikliği nedeniyle bazı sorunların ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.</i>	
İmza:	Tarih:

EK 3 - ŞİKAYET KAPATMA FORMU

ŞİKAYET KAPATMA FORMU		
Şikâyet kapanma numarası:		
Gerekli acil eylemi tanımlayın:		
Gerekli olan uzun vadeli eylemi tanımlayın (gerekirse):		
Tazminat Gerekli mi?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR
HIZLI EYLEM VE KARARIN KONTROLÜ		
İyileştirme Eyleminin Aşamaları	Son Tarih ve Sorumlu Kurumlar	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

TAZMİNAT VE NİHAİ KADEMELER

Bu kısım tazminat ücretlerini aldıktan ve Şikâyetinin giderilmesinden sonra şikâyet sahibi tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır.

Notlar:

[Ad / Soyad ve İmza]

Tarih: ___ / ___ / ____

Şikâyet Sahibinin:

Sorumlu Kurum / Şirket Temsilcisi

[Ünvan / Adı / Soyadı ve İmzası]

EK 4 – ULUSAL MEVZUAT VE DB YÖNERGELERİ

1- Ulusal Mevzuat

Çevre Yasası ilgili yönetmelikler ile ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak çevre incelemesini içeren ve dolayısıyla Proje için de geçerli olan diğer kanun, yönetmelikler ve tebliğler aşağıda sıralanmıştır:

- ÇED Yönetmeliği, 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete(ÇED Yönetmeliği kapsamında değildir.)
- Enerji Verimliliği Kanunu (5627 sayılı kanun), 2 Mayıs 2007 tarihli ve 26510 sayılı Resmi Gazete
- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 5 Aralık 2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete
- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 20 Mart 2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete
- Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik, 14 Nisan 2008 tarihli ve 26847 sayılı Resmi Gazete
- Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, 27 Ekim 2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete
- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, 10 Temmuz 2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 19 Aralık 2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete
- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (MHG/2017-13)
- Yeraltı Suları Hakkında Kanun (No: 167), 23 Aralık 1960 tarihli ve 10688 sayılı Resmi Gazete
- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2863 sayılı kanun), 23 Temmuz 1983 tarihli ve 18113 sayılı Resmi Gazete
- Karayolları Trafik Kanunu (2918 sayılı kanun), 18 Ekim 1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete
- Karayolları Trafik Yönetmeliği, 18 Temmuz 1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İlişkin Yönetmelik, 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete
- Afet Bölgelerinde Yapılar Hakkında Yönetmelik, 14 Temmuz 2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete
- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete;
- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, 24 Ekim 2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete
- Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthalı, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük, 29 Eylül 1987 tarihli ve 19589 sayılı Resmi Gazete
- Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik, 6 Ocak 2017 tarihli ve 29940 sayılı Resmi Gazete
- Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik, 7 Nisan 2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete
- Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik, 11 Şubat 2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmi Gazete

- Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, 07 Nisan 2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete
- Tehlikeli Maddelerin Su Ortamında ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, 26 Kasım 2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmi Gazete
- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, 17 Şubat 2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete
- Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, 8 Ocak 2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmi Gazete
- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, 25 Kasım 2006 tarihli ve 26357 sayılı Resmi Gazete'de ve son olarak 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete'de revize edilmiş
- Atıkların Düzenli Depolamasına Dair Yönetmelik, 26.03.2010 tarihli ve 27333 sayılı Resmi Gazete'de ve son olarak 11.03.2015 tarihli ve 2992 sayılı Resmi Gazete'de revize edilmiştir
- Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, 21 Aralık 2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete
- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 6 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete
- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrol Yönetmeliği, 31 Ağustos 2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmi Gazete ve son olarak 5 Kasım 2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete'de revize edilmiş
- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, 22 Mayıs 2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmi Gazete
- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete

Türkiye'de atık yönetimi alanındaki çalışmalar, son yıllarda sosyal ve politik duyarlılığı artırarak çok önemli bir gelişme göstermiştir. Türkiye'nin 2023 vizyonuna ulaşmak için önemli bir nokta olarak kabul edilen Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi Eylem Planı ile atığın ekonomik boyutunun uygulanması için adımlar atılmaktadır. Türkiye'de asbest atık bertaraf tesisleri için lisanslı 37 şirket ve flüoresan lambaların imhası için lisanslı 95 şirket bulunmaktadır. Asbest içeren yalıtım malzemelerinin ve cıva içeren floresan lambaların imhası gibi tehlikeli malzemelerin bertarafı Atık Yönetimi Yönetmeliği' ne göre yapılacaktır. Atık bertaraf firmalarına ulaşım ve alt yapı gibi arazilerin bu özellikleri göz önüne alındığında, proje faaliyetlerinden önemli bir çevresel risk beklenmemektedir. Bu bağlamda, Projenin potansiyel etkilerini azaltmak ve yönetmek için bu ÇSYP'nin yeterli olduğu varsayılmaktadır. Olası olumsuz ve plan dışı durumlar söz konusu olduğunda da ÇSYP güncellenecektir.

1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG): İnşaat işleri, önlemler alınmadığında çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek kazalara neden olabilir. Bu nedenle ÇŞİDB, denetim danışmanları ve yükleniciler çalışanlara 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. İşçilere iş tanımları, sorumluluklar ve İSG ile ilgili riskler hakkında bilgi verilir. Çalışanlara düzenli kişisel eğitimlerle gerekli kişisel koruyucu donanım ve iş ve iş güvenliği hakkında bilgi sağlanacaktır. İnşaat işleri başlamadan önce yapılacak tüm işler için bir Risk Değerlendirme Raporu hazırlanacak ve ilgili risklerden kaçınmak için gerekli önlemler alınacaktır. Olası bir kaza için "Acil Müdahale Planları" hazırlanacak, acil durum ekipleri oluşturulacak ve acil durum senaryoları doğrultusunda tatbikatlar ve eğitim yapılacaktır.

Alt Projeler için Risk Değerlendirme Raporu Metodolojisi: Proje aşağıdaki adımları takip edecek ve destekleyici belgeler sağlayacaktır (Planlar, prosedürler vb.). Projelerin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uyum durumu aşağıda belirtilen iki faaliyette değerlendirilecektir:

- **Masa İncelemesi -Ön doküman incelemesi:** Mevcut proje dokümanlarının ve saha ziyaretinden önce sağlanan S&G Planı, Acil Müdahale Planı, Risk Değerlendirmeleri vb. gibi bilgilerin ön büroda incelemesi.
- **Saha ziyareti ve Fiziksel saha incelemesi:** Ziyaret sırasındaki aktiviteler şunları içerecektir:
 - Toplantılar ve görüş alma: Yöneticiler ile S&G Temsilcileri toplantılar düzenleyecek ve görüş alışverişi sağlayacaktır. Proje Sahibinin / Yüklenicinin personeli; Projelerin ilerlemesi ve devam eden çalışmaların anlaşılması ve bilgi sahibi olunması için düzenli raporlama yapmalıdır.
 - Saha incelemesi: Fiili fiziksel saha şartlarını ve çalışma koşullarını, iş sağlığı ve güvenliği yapılarını ve planlanan önlemleri ve uygulamaları doğrulamak amacıyla projelerin farklı kısımlarında ve bileşenlerinde sahanın gezilmesi ve incelemesi yapılacak, uygunsuz durumları özellikle belirtmek üzere çeşitli noktalardan fotoğraflar çekilmelidir.
 - Belge toplama / inceleme: Saha ziyareti sırasında sunulan ayrıntılı S&G belgelerinin toplanması ve gözden geçirilmesi ve Saha Temsilcileri (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Şantiye Şefi, vb.) ile birlikte ilk inceleme yapılmalıdır.
 - Genel olarak sağlanan bilgilerin ve raporlamanın gözden geçirilmesi: Genel S&G hususları gözden geçirilmeli ve değerlendirilmeli, akabinde Proje S&G İzleme Raporu hazırlanmalıdır.

1.2. Toplum Sağlığı ve Güvenliği (TSG): Alt projeler, yöre halkının sürekli erişime sahip olacağı kamu binalarında uygulanacağından, yerinde yapılacak yenileme faaliyetlerinin bina kullanan insanlar üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu bağlamda yüklenici, tadilat işlerini halka açık erişimden izole edecektir. İnşaat alanları, olası kazaları önlemek için çitler ve uyarı işaretleri ile çevrili olacaktır. Toz ve gürültü de halk için rahatsızlıklar oluşturabilir, bu nedenle çalışma saatlerine dikkat edilecek ve gerektiğinde yenileme alanının yalıtılmasıyla etkiler önlenecektir. Yenileme altındaki binaya sürekli ve güvenli giriş, engelli kişiler gibi korunmasız gruplar da göz önünde bulundurularak her zaman halka açık olacaktır.

1.3. GES gereği Fotovoltaik Panel Kurulumu: “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” kapsamında Fotovoltaik panel kurulumu için yetkili enerji dağıtım şirketine başvuru yapılacaktır. “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” kapsamında Trijenerasyon sisteminin kurulması için gerekli cihaz seçimi yapıldıktan sonra Yüklenici, yetkili enerji dağıtım şirketine ve yerel gaz dağıtım şirketine başvuruda bulunacaktır.

2- Dünya Bankası Grubu Çevre, Sağlık ve Güvenlik (DB ÇSG) Yönergeleri

Önceki paragraflarda belirtildiği gibi, proje hem Türkiye yasalarına ve düzenlemelerine hem de Dünya Bankası'nın Çalışma Politikalarına uygun olarak uygulanacaktır. Bu nedenle, Türkiye'deki İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ek olarak yeniden yapılanma ve güçlendirme çalışmaları Dünya Bankası Genel ÇSG Kılavuzlarına uygun olarak yürütülecektir.

a) OP 4.11. Fiziksel Kültürel Kaynaklar (FKK)

Yenileme için önerilen kamu binaları yanı sıra, önerilen proje sahalarının da özel koruma gerektiren arkeolojik ve kültürel varlık olarak tanımlanması durumu söz konusu olabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, özellikle 21.07.1983 tarihli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu (27.07.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile revize edilmiş) ve uygulamaları Dünya Bankası gereklerine benzerdir. Kanun, Kültürel Miras olarak kabul edilen taşınır ve taşınmaz kültürel ve doğal varlıklar için bir tanım vermektedir; bu varlıkların korunmasına ilişkin prosedürleri ve düzenlemeleri açıklar ve uygulama kararlarından sorumlu olacak kurumların koruma ilkeleri ile rol ve sorumluluklarını belirler.

Dünya Bankası, kültürel kaynakların korunmasında çok hassastır ve Kültürel Miras Varlıklarının DB tarafından finanse edilen projelerden olumsuz etkilenmemesi için büyük özen gösterir. Dünya Bankası'nın Kültür Miras ile ilgili politikası OP 4.11'de açıkça belirtilmiştir. Bu politikaya ilişkin olarak, DB, DB tarafından finanse edilen projelerin hazırlanması ve uygulanmasında bazı tedbirlerin alınmasını gerektirir. Kültürel varlıkların korunmasına ilişkin ulusal mevzuat sıkı bir şekilde uygulandığından, DB tedbir politikalarının dışında ilave bir koşul beklenmemektedir. Bununla birlikte, rastlantısal bulgular ya da şans eseri bulunan kültürel yapıtların yönetimini kapsayan bir rastlantısal bulgu durumunda denetim danışmanları ve yüklenicileri izlenecek adımlar konusunda uyaracak olan “Rastlantısal Bulgu Prosedürü” hazırlanacaktır. Buna ek olarak, tüm ilgili resmi yazışmalar sahaya özgü ÇSYP'ye eklenecektir. Ek olarak, ihtiyaç duyulması halinde, arkeolojik ya da kültürel varlıklar hakkında detaylı bir değerlendirme raporu da ÇSYP'ye dahil edilecektir.

Kültürel mirasın korunmasına ilişkin güçlü yerel düzenlemeler ve uygulamalar göz önüne alındığında geri dönüşü olmayan etkiler gözlemlenmeyeceği ön görülmekte, bu kapsamda da mevcut projenin Çevresel Değerlendirme (ÇD) süreci göz önüne alındığında Kültürel Mirasa etkisi beklenmemektedir. Renovasyonu yapılacak binalar kültürel miras kapsamında korunması gereken yapılar kapsamında değildir.

b) OP 4.04. Doğal Habitatlar

Bu proje için tetiklenmemektedir, çünkü kamu binaları halihazırda inşa edilmiş olduğundan ve konut alanlarına yakın inşa edildiğinden, tüm yenileme çalışmaları “doğal yaşam alanı” olarak nitelendirilmeyen alanlarda yapılacaktır.

c) OP 4.12. İstemsiz Yeniden Yerleşim

Mevcut tüm kamu arazilerinin merkezi hükümete tayin edilmesinden dolayı Projenin istemsiz bir yeniden yerleşim veya arazi edinme faaliyeti gerektirmemesi beklenmektedir. Projeye bahis seçilmiş arazilerde/arazilerde tapu veya mülkiyet sorunu yoktur. Bu proje kapsamında daha fazla arazi edinimi veya kamulaştırma öngörülmemektedir.

Mevcut kamu binalarının bazılarında, özellikle de yenilenecek okullar, öğrencilerin yakındaki diğer kamu binalarına taşınması gerekebilir. Okul tatili sırasında yenileme faaliyetlerinin uygulanması için tüm çabalar harcanacaktır (örneğin, yaz tatili, kış tatili vb.), Ancak öğrencilerin farklı binalarda eğitim görmek için taşınmasının kaçınılmaz olması durumunda ÇŞİDB, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapacaktır.

ÇŞİDB, kamu binalarının yenilenmesi sırasında karşılaşılabilecek şikâyetleri çözmek ve yönetmek ve ayrıca kamu binaları faaliyete geçtikten sonra diğer sosyal meseleleri de ele almak için bir şikâyet mekanizması kuracaktır. Bu mekanizma, halkın proje ile ilgili her türlü şikâyet/görüş/önerisi için kullanılacaktır.

3- COVID-19 Rehberleri

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) REHBERLERİ

Kamuya Tavsiyeler

- DSÖ sosyal mesafe, solunum hijyeni, kişisel karantina ve tıbbi tavsiye alınması ile ilgili kamuya tavsiyeler vermektedir ve bunlar DSÖ internet sitesinde bulunabilir: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>

Teknik Rehberler

- 19 Mart 2020 tarihinde yayınlanan *koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonundann şüphe edilen durumlarda sağlık hizmetleri sırasında bulaşmanın önlenmesi ve kontrolü,*
- 1 Nisan 2020'de yayınlanan *Hijyen Uygulamalarının İyileştirilmesi için Üye Devletlere Tavsiyeler,*
- 2018'de yayınlanan *Sağlık hizmeti veren tesislerde bulaşmanın önlenmesi ve kontrolü (kısıtlı kaynakları olan ortamlara odaklanarak),*
- 18 Mart 2020'de yayınlanan *Koronavirüs hastalığı 2019 (Covid-19) ile ilgili laboratuvar biyogüvenlik rehberi,*
- 2014'te yayınlanan *Laboratuvar Biyogüvenlik Kılavuzu,3.baskı,*
- 19 Mart 2020'de yayınlanan *Örnek toplama ve gönderme de dahil olmak üzere Covid-19 için laboratuvar testleri,*
- 21 Mart 2020'de yayınlanan *4C's Bulaşma Senaryolarına Göre Önceliklendirilmiş Laboratuvar Test Stratejisi,*
- 24 Mart 2020'de yayınlanan *Covid-19 bağlamında bir ölü bedenin güvenli yönetimi için Bulaşma Önleme ve Kontrol,*
- 11 Şubat 2020'de yayınlanan *Covid-19 salgını ile ilgili olarak seyahat eden kişilerin geri dönüşleri ve karantinaları için önemli bilgiler,*
- 17 Nisan 2020'de yayınlanan *Kamp olmayan ortamlardaki mülteciler ve göçmenler için Covid-19 'a hazırlık, önleme ve kontrol,*
- 18 Mart 2020'de yayınlanan *Koronavirüs hastalığı (Covid -19) salgını: İş güvenliği ve sağlığı bilgileri de dahil olmak üzere sağlık çalışanlarının hakları, rolleri ve sorumlulukları,*
- 4 Nisan 2020'de yayınlanan *Oksijen kaynakları ve Covid-19 tedavi merkezlerindeki dağılımı,*
- 16 Mart 2020'de yayınlanan *Risk Bilgilendirme ve Topluluk katılımı Eylem Planı Rehberi Covid-19 Hazırlık ve Yanıt,*
- 19 Mart 2020'de yayınlanan *Koronavirüs hastalığı (Covid-19) için sınırlama bağlamında kişilerin karantinasına yönelik bilgiler,*
- 19 Mart 2020'de yayınlanan *Sağlık tesisleri ve toplulukta Covid-19 vaka yönetimi için işletimsel bilgiler,*
- 27 Şubat 2020'de yayınlanan *kışisel koruyucu donanımların Koronavirüs hastalığı 2019 (Covid-19) için akılcı kullanımı,*
- 19 Mart 2020'de yayınlanan *İşyerinizi Covid-19'a hazır hale getirme,*
- 19 Mart 2020'de yayınlanan *Covid-19 için su, hafızsıhha, hijyen ve atık yönetimi,*
- 2014'te yayınlanan *Sağlık etkinliklerinden ortaya çıkan atıkların güvenli yönetimi,*
- 19 Mart 2020'de yayınlanan *Yeni Koronavirüs (Covid -19) salgını bağlamında toplulukta, evde ve sağlık merkezlerinde gerçekleşen bakım sırasında maske kullanımı hakkında tavsiye,*
- 26 Mart 2020'de yayınlanan *Covid-19 salgını sırasında Engelli Bilgileri*

DÜNYA BANKASI GRUBU REHBERLERİ

- 20 Mart 2020’de yayınlanan Teknik Not: Kamu toplantıları yapma noktasında kısıtlamalar olan durumlarda DB tarafından desteklenen projelerde Kamu İstişareleri ve Paydaş Katılımı,
- 25 Mart 2020’de yayınlanan Teknik Not: Covid-19 Etkinliklerine Destek Olması için Askeri Güçlerin Kullanımı,
- 7 Nisan 2020’de yayınlanan ÇSÇ/Koruma Önlemleri Geçici Notu:Yapı/İnşaat İşi Projeleri için Covid-19 Bilgileri,
- Mart 2020’de yayınlanan HNP COVID Yanıt Etkinlikleri için Cİ/Ş ile ilgili Teknik Not,
- 6 Nisan 2020’de yayınlanan İş Yerinde Covid-19 Sağlık Risklerinin Önlenmesi ve Yönetilmesi ile İlgili IFC Müşterileri için Geçici Tavsiye,
- 6 Nisan 2020’de yayınlanan Covid-19 Bağlamında Çalışanların Desteklenmesi ile İlgili IFC Müşteri için Geçici Tavsiye,
- 6 Nisan 2020’de yayınlanan Krize Yanıt ile İlgili Şirket Liderliği için IFC Bilgi Notu: Covid-19 Pandemisi ile Mücadele,
- 30 Nisan 2020’de yayınlanan Sağlık Merkezleri için ÇSS Rehberleri

ILO REHBERLERİ

- 23 Mart 2020’de yayınlanan ILO Standartları ve Covid-19 ile İlgili SSS, (uluslararası çalışma standartları ve Covid-19 ile ilgili en sık sorulan soruların yanıtlarının derlemesi)

MFI REHBERLERİ

- ADB Covid-19 Pandemisi Sırasında Bulaşıcı Tıbbi Atıkların Yönetilmesi
- Covid-19 ile İlgili Altyapı Projeleri için IDB Yatırım Rehberi:Hızlı Bir Yatırım Profili ve Karar Çerçevesi
- 31 Mart 2020' de Yayınlanan KfW DEG Çalışanlar için Covid -19 Rehberi,
- 23 Mart 2020'de yayınlanan CDC Grubu Çalışanlar için Covid -19 Rehberi

EK 5– ASBEST BULUNAN BİNALARDA İZLENECEK PROSEDÜR

Asbest söküm ve temizlik işlemi en az 1 Asbest Söküm Uzmanı nezaretinde süre ve ihtiyaca bağlı olarak belirlenecek adette Asbest Söküm Çalışanı ile beraber yapılmalıdır. Söküm planlaması yapılırken mevsim koşulları dikkate alınmalıdır.

SÖKÜM İŞİNE BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR VE YASAL ZORUNLULUKLAR

- 1-Asbestin türünün belirlenmesi
- 2-İş planının ve organizasyon yapısının hazırlanması
- 3-İş Güvenlik Uzmanının belirlenmesi (şantiyeler NACE koduna göre çok tehlikeli sınıftır)
- 4-Şantiye risk analizinin hazırlanması
- 5-Şantiye asbest risk analizinin hazırlanması
- 6-Şantiyenin mevcut durumunun fotoğraflanması
- 7-Asbest Söküm Çalışanı belgeli çalışanların sayısının ve görevlerinin belirlenmesi
- 8-Asbest Söküm Uzmanının belirlenmesi
- 9-SGK girişleri, sağlık kontrolleri (yüksekte çalışma dahil, solunum fonksiyon testleri dahil), iş güvenliği eğitimlerinin tamamlanması, belgelenmesi veya belgelerin kontrol edilmesi
- 10-Belge ve dosyaların "Asbest Söküm Uzmanı" tarafından hazırlanması ve denetlenmesi
- 11-Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğüne Bildirimin Yapılması

SÖKÜM İŞİNE BAŞLAMADAN ÖNCE SAHADA YAPILACAK HAZIRLIKLAR

A – Söküm Bölgesinin Hazırlanması

Karantina gereken bir yer olursa, bu bölgenin tüm açık yerlerinin kapatılması gerekmektedir.

Arındırma kabinlerin kurulması: Arındırma kabinleri, duşları ihtiva etmektedir. Asbest söküm çalışanları her molada temizlenmelidir.

Bölgenin güvenlik levhaları ve uyarı yazıları çevrilip, izole edilmeli, görevi olmayan kişilerin alana girmesi engellenmelidir.

B – Kullanılacak Malzeme ve Kişisel Koruyucu Donanımlar

- 1-Personel için yeterli sayıda sızdırmaz tulum (Tip 5-6)
- 2-Personel için yeterli sayıda toz maskesi, FFP3 veya tam yüz maskesi
- 3-Personel için yeterli sayıda sızdırmaz eldiven
- 4-Özel bantlar
- 5-Özel sızdırmaz folyolar ve/ veya asbest çuvalları-atık çuvalları (big-bag` ler)
- 6-Filtreli endüstriyel toz çekme süpürgesi
- 7-Kimyasal sıvısı ve uygulama cihazı (özel lif yapıştırma sıvısı)
- 8-Uygun iş ayakkabıları, baret ve/ veya kask
- 9-Emniyet kemerleri
- 10-Ortama göre kullanılacak farklı KKD`ler ve diğer ekipmanlar
- 11-Güvenlik bantları ve güvenlik levhaları
- 12-İlk yardım malzemeleri

ASBESTLİ MALZEMENİN ENKAPSÜLE EDİLEREK, KESİLİP, SÖKÜLMESİ

Atermitlerin ve/veya kontamine malzemelerin uygun şekilde tozları havalandırmadan ve mümkün olduğunca kırmadan kesilmesi. Ayrıca kesim yapmaya başlamadan önce kimyasal yapıştırıcı sıvının tozu hapsetmesi için, ilgili alana sıkılması gerekmektedir.

Kesilip, sökülen parçaların, özel sızdırmaz folyolara ve/veya asbest çuvallarına yapıştırıcı sıvı sıkılarak (big-bag) konması, paketlenip, etiketlendikten sonra bertarafa gitmek üzere, işletmenin gösterdiği ara depolama alanına yerleştirilmesi sağlanır.

SÖKÜMDEN SONRA YAPILACAK İŞLER

- 1-Kapalı alanlarda, gerekli görülen yerlerin filtreli endüstriyel tip temizleme makinesi ile tüm bölgenin ve yerlerin temizlenmesi, gerek yoksa nemlendirilmesi / ıslatılması**
- 2-İlaçlı ve/veya ilaçsız sıvı malzeme ile yağ temizlik yapılması**
- 3-Lif yapıştırıcı özel sıvı malzeme ile tüm bölgenin ilaçlanması ve bekletilmesinin sağlanması**

BERTARAF PROSESİ

"Atık Yönetimi Yönetmeliğine" göre; bertaraf prosesinin uygulanması kontrol edilmelidir. Yönetmeliğe göre uygun şekilde paketlenmiş asbestli ve/veya kontamine atıkların, etiketlenmesi, istiflenmesi, lisanslı araçlar ile lisanslı bertaraf tesisine gönderilmesi, ilgili atık formlarının (UATF) doldurulması gerek Çalışma Bakanlığı gerekse Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kendi mevzuatları açısından önemlidir.

ASBESTLİ ATIKLARIN BERTARAFI

- Asbestli atıklar mutlaka sarılmalı ve kırılmadan paketlenmelidir.
- Asbestli atıklar kırılmadan paketlenildikten sonra etiketlenmelidir.
- Asbestli atıklar HAFRİYAT SAHALARINA ve ÇÖPLÜKLERE dökülemez.
- Asbestli atıklar dere kenarlarına dökülemez.
- Asbestli atıklar yanmaz.
- Asbestli atıklar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevrimiçi programı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (E-ÇBS) üzerinden atık yönetimi uygulaması kullanılarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmelidir.

EK 6- ENERJİ KİMLİK BELGESİ

ÖN HESAP SONUÇ RAPORU

Bina Bilgileri

Tipi: Hastane

İnşaat Başlangıç Tarihi: 1-1-2009


Toplam Alan: 3.527,00

İklimlendirilen Alan: 3.527,00

UAVT Bina No:

Adres: Pamukkale Üniversitesi Onkoloji Hastanesi
PAMUKKALE/ DENİZLİ

Bina Enerji Verimliliği



ENERJİ PERFORMANSI ORAN

A	0 - 39
B	40 - 79
C	80 - 99
D	100 - 119
E	120 - 139
F	140 - 174
G	175 - ...

99

SERA GAZI EMİSYONU

86,24 kg CO₂eq/m²yr

A	0 - 39
B	40 - 79
C	80 - 99
D	100 - 119
E	120 - 139
F	140 - 174
G	175 - ...

99

YENİLENERLENER ENERJİ KULLANIMI ORANI

0,00

SİTEMLER	YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ (kWh/yıl)		YENİLENERLENER ENERJİ (KÜÇÜK ENERJİ)		SINIFI
	Birimli (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² yıl)	Birimli (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² yıl)	
Toplam	1.195.339,52	338,91	0,00	0,00	C
Isıtma	229.330,22	65,02	0,00	0,00	D
Sıhhi Sıcak Su	626.685,42	177,68	0,00	0,00	D
Solunum	151.439,94	42,94	0,00	0,00	C
Havalandırma	37.229,35	10,56			D
Aydınlatma	150.654,59	42,71			C
Kojenasyon	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fotovoltaik			0,00	0,00	

Belge Düzenleyicisi

Adı Soyadı: _____ **Tarih:** _____

Firma: _____ **İmza:** _____

Yapı ruhsatına esas projeye ve eklerine göre düzenlenmiş olup, Enerji Kimlik Belgesi yerine kullanılamaz.
*Muhimel yapı ruhsatı başvuru tarihini ifade eder.

Şekil 5 Mevcut Enerji Kimlik Belgesi_Onkoloji Hastanesi

Proje Kodu LOAN - IBRD-9015 | EEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-09 Bina Adı PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tarih 14.12.2022 Başlangıç | Bitiş Saati 14 : 00 | 15 : 12

Tablo 11 Katılımcı Listesi & İletişim Bilgileri

İSİM SOY İSİM	GÖREV	TELEFON NO	E-MAİL ADRESİ	İMZA
Fatih Mangırcı	Hastane Müdür Yardımcısı			
Mustafa Bozkurt				
Nuray Alan				
Selçuk Akyol	Öğretim Üyesi			
Zeynep Akyer				
Arzu Demirel				
Dilek Kodal	Öğretim Üyesi			
Mehmet Başarslan				
Nihal Büler				
Özay Yıldız				

İSİM SOY İSİM	GÖREV	TELEFON NO	E-MAİL ADRESİ	İMZA
Turan Paker				
Murat Balkıs				
Selçuk Arslan				
Selçuk Akyol				
Serkan Sert				
Tuğba Sarı				
Ufuk Yağcı				
Musa Özcan				
Orhan Evşen				
A. Naci İŞIKLI	Proje Koordinatörü	-	naci.isikli@tumas.com.tr	
Birsen Bakır	Enerji Etüt Proje Uzmanı Moderatör			
Hüseyin TAVASLIOĞLU	Enerji Sistemleri Mühendisi	0534 890 3879	huseyin.tavaslioglu@tumas.com.tr	

İSİM SOY İSİM	GÖREV	TELEFON NO	E-MAİL ADRESİ	İMZA
Pelin Antep	Mimar	0506 690 0797	pelin.antep@atlasert.com.tr	
Seyfullah Doğdaş				
Deniz Çelik	Çevre Mühendisi (ÇŞİDB)			

Açıklama: Paydaş katılım toplantısı dijital platformda (<https://us02web.zoom.us/j/83052878001?pwd=QTluZmN4NW5sYnZwNEdCaVF0eTgrQT09>⁸) gerçekleştirilmiştir. Katılımcı bilgilendirme ve onayı sonrasında video kaydı gerçekleştirilmiştir. Valilik katılımcıları tarafından oluşturulan imza föyü bu rapor ekinde dikkatinize sunulmuştur.

⁸ Toplantı Kimliği: 830 5287 8001

Tablo 12 Toplantı Ajandası

BAŞLANGIÇ SAATİ	BİTİŞ SAATİ	AKTİVİTE																								
14 : 00	14 : 01	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde toplantı kaydı ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel bilgilendirme yapılmıştır. Toplantı kaydına karşı çıkan katılımcı söz konusu değildir. 14:01 itibari ile tüm toplantı *.mp4 görüntü formatında ve *.m4a ses dosya formatında kaydedilmiştir. Ayrıca toplantı mesajları da *.txt formatında kayıt altına alınmıştır.																								
14 : 02	14 : 06	Toplantı başlangıç konuşması (Moderatör Birsen Bakır)																								
14 : 06	14 : 08	KABEV projesi ve amaçları hakkında sunum üzerinden açıklama yapıldı. Resim 1 Sunum Dosyası Paylaşılan Bölümler_01  <p>Resim 1 Sunum Dosyası Paylaşılan Bölümler_01, KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ sunumunun ilk bölümüdür. Sunumun baş kısmında Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, KABEV ve The World Bank logosu yer almaktadır. Sunumun başlığı "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi"dir. Projenin amacı, enerji verimliliği etüdü, tadilat uygulama projeleri ve inşaat müşavirliği için danışmanlık hizmetidir. Proje Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Sunumun ikinci bölümü "GENEL PROJE BİLGİLERİ"ni içerir. Bu bölümde KABEV Projesi'nin genel amacı, merkezi hükümet binalarında enerji tüketimlerini düşürmek, ulusal bir programı desteklemek için sürdürülebilir finansman ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek ve ölektlendirmenin bir geçiş planı geliştirmek olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, proje ile kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik iyileştirmeler yapılacakları ve bunların enerji verimliliği ile sarsa çarın emisyollarının azaltılması, enerji verimliliği azaltılması yoluyla ulusal düzeyde enerji açığını azaltılması, sarsa çarın emisyollarının azaltılması yoluyla iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, sosyal ve ekonomik fayda sağlanması ve enerji verimliliği konusunda toplumda farkındalık için artırımsı amaçlanmaktadır.</p>																								
14 : 08	14 : 09	KABEV projesi çerçevesinde incelenen yapıya ve yıllık enerji tüketimlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Resim 2 Sunum Dosyası Paylaşılan Bölümler_02  <p>Resim 2 Sunum Dosyası Paylaşılan Bölümler_02, KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ sunumunun ikinci bölümüdür. Sunumun baş kısmında Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, KABEV ve The World Bank logosu yer almaktadır. Sunumun başlığı "PROJE SAHAŞI BİLGİLERİ"dir. Bu bölümde, projenin kapsamındaki binaların enerji tüketimlerine ilişkin bilgiler paylaşılmıştır. Sunumun ikinci bölümü "Bu eÜİ kapsamında bulunan 20 binanın tahmini toplam yıllık ortalama elektrik, doğalgaz ve enerji tüketimleri tablosu aşağıda verilmiştir." olarak başlanmaktadır. Tablo aşağıdaki gibidir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>YILKİ ORTALAMA ENERJİ TUKETİMİ</th> <th>TRKJULYAKI KAT TUKİDİ MET²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>20.447.554 kWh 2.448 MEP</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>20.111.118 kWh 2.414 MEP</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>24.297.735 kWh 2.913 MEP</td> </tr> <tr> <td>YILKİ ORTALAMA DOĞALGAZ TUKETİMİ</td> <td>3.248.200 m³ 37.285.204 kWh 2.474 TEP</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3.220.271 m³ 38.045.940 kWh 2.912 TEP</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3.174.402 m³ 38.471.201 kWh 2.622 TEP</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3.895.877 m³ 29.719.337 kWh 2.554 TEP</td> </tr> <tr> <td>YILKİ ORTALAMA ENERJİ VERİMLİLİĞİ</td> <td>85,326 TJPKI KAT 2,022 MEP</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>85,326 TJPKI KAT 2,022 MEP</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>87,155 TJPKI KAT 2,031 MEP</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>86,672 TJPKI KAT 2,029 MEP</td> </tr> </tbody> </table>	YILKİ ORTALAMA ENERJİ TUKETİMİ	TRKJULYAKI KAT TUKİDİ MET ²	2017	20.447.554 kWh 2.448 MEP	2018	20.111.118 kWh 2.414 MEP	2019	24.297.735 kWh 2.913 MEP	YILKİ ORTALAMA DOĞALGAZ TUKETİMİ	3.248.200 m ³ 37.285.204 kWh 2.474 TEP	2017	3.220.271 m ³ 38.045.940 kWh 2.912 TEP	2018	3.174.402 m ³ 38.471.201 kWh 2.622 TEP	2019	3.895.877 m ³ 29.719.337 kWh 2.554 TEP	YILKİ ORTALAMA ENERJİ VERİMLİLİĞİ	85,326 TJPKI KAT 2,022 MEP	2017	85,326 TJPKI KAT 2,022 MEP	2018	87,155 TJPKI KAT 2,031 MEP	2019	86,672 TJPKI KAT 2,029 MEP
YILKİ ORTALAMA ENERJİ TUKETİMİ	TRKJULYAKI KAT TUKİDİ MET ²																									
2017	20.447.554 kWh 2.448 MEP																									
2018	20.111.118 kWh 2.414 MEP																									
2019	24.297.735 kWh 2.913 MEP																									
YILKİ ORTALAMA DOĞALGAZ TUKETİMİ	3.248.200 m ³ 37.285.204 kWh 2.474 TEP																									
2017	3.220.271 m ³ 38.045.940 kWh 2.912 TEP																									
2018	3.174.402 m ³ 38.471.201 kWh 2.622 TEP																									
2019	3.895.877 m ³ 29.719.337 kWh 2.554 TEP																									
YILKİ ORTALAMA ENERJİ VERİMLİLİĞİ	85,326 TJPKI KAT 2,022 MEP																									
2017	85,326 TJPKI KAT 2,022 MEP																									
2018	87,155 TJPKI KAT 2,031 MEP																									
2019	86,672 TJPKI KAT 2,029 MEP																									
14 : 09	14 : 11	NZEB bina nedir açıklandı ve proje kapsamındaki hangi binaların nZEB bina olacağı hakkında bilgi verildi.																								

	 <p>KABEV PROJESİ KAPSAMINDA BULUNAN BİNALARIN LİSTESİ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BİNA ADI</th> <th>YERİ</th> <th>YAPILIM YILI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Akademi Binası</td><td>1. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>2. Akademi Binası</td><td>2. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>3. Akademi Binası</td><td>3. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>4. Akademi Binası</td><td>4. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>5. Akademi Binası</td><td>5. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>6. Akademi Binası</td><td>6. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>7. Akademi Binası</td><td>7. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>8. Akademi Binası</td><td>8. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>9. Akademi Binası</td><td>9. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>10. Akademi Binası</td><td>10. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>11. Akademi Binası</td><td>11. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>12. Akademi Binası</td><td>12. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>13. Akademi Binası</td><td>13. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>14. Akademi Binası</td><td>14. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>15. Akademi Binası</td><td>15. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>16. Akademi Binası</td><td>16. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>17. Akademi Binası</td><td>17. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>18. Akademi Binası</td><td>18. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>19. Akademi Binası</td><td>19. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> <tr><td>20. Akademi Binası</td><td>20. Akademi Binası</td><td>2010</td></tr> </tbody> </table> <p>Pamukkale Üniversitesinde 20 bina KABEV projesi kapsamında değerlendirilmiştir. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi A Blok binaları nZEB (Nearly Zero Energy Building) bina olarak belirlenmiştir.</p>  <p>NZE BİNA NEDİR?</p> <ul style="list-style-type: none"> Düşük primer enerji kullanan ve üretilen yenilenebilir enerjinin bir kısmını satarak, yıllık enerji bilançosunu sıfır yapabilen bir bina. Bir başka ifadeyle burada net biletçe olarak primer enerji tüketimi yoktur. Çok yüksek enerji performansına sahip olmanın yanı sıra, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan ve böylelikle çok düşük seviyede tehlikeli emisyonu neden olan binalardır. <p>BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETİMLERİ Resmî Gazete: Tarih: 05.12.2020 Resmî Gazete Sayısı: 27075 (Ek RG-192/2022-31755) Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (nZEB) Yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan binaları ifade eder.</p>	BİNA ADI	YERİ	YAPILIM YILI	1. Akademi Binası	1. Akademi Binası	2010	2. Akademi Binası	2. Akademi Binası	2010	3. Akademi Binası	3. Akademi Binası	2010	4. Akademi Binası	4. Akademi Binası	2010	5. Akademi Binası	5. Akademi Binası	2010	6. Akademi Binası	6. Akademi Binası	2010	7. Akademi Binası	7. Akademi Binası	2010	8. Akademi Binası	8. Akademi Binası	2010	9. Akademi Binası	9. Akademi Binası	2010	10. Akademi Binası	10. Akademi Binası	2010	11. Akademi Binası	11. Akademi Binası	2010	12. Akademi Binası	12. Akademi Binası	2010	13. Akademi Binası	13. Akademi Binası	2010	14. Akademi Binası	14. Akademi Binası	2010	15. Akademi Binası	15. Akademi Binası	2010	16. Akademi Binası	16. Akademi Binası	2010	17. Akademi Binası	17. Akademi Binası	2010	18. Akademi Binası	18. Akademi Binası	2010	19. Akademi Binası	19. Akademi Binası	2010	20. Akademi Binası	20. Akademi Binası	2010
BİNA ADI	YERİ	YAPILIM YILI																																																														
1. Akademi Binası	1. Akademi Binası	2010																																																														
2. Akademi Binası	2. Akademi Binası	2010																																																														
3. Akademi Binası	3. Akademi Binası	2010																																																														
4. Akademi Binası	4. Akademi Binası	2010																																																														
5. Akademi Binası	5. Akademi Binası	2010																																																														
6. Akademi Binası	6. Akademi Binası	2010																																																														
7. Akademi Binası	7. Akademi Binası	2010																																																														
8. Akademi Binası	8. Akademi Binası	2010																																																														
9. Akademi Binası	9. Akademi Binası	2010																																																														
10. Akademi Binası	10. Akademi Binası	2010																																																														
11. Akademi Binası	11. Akademi Binası	2010																																																														
12. Akademi Binası	12. Akademi Binası	2010																																																														
13. Akademi Binası	13. Akademi Binası	2010																																																														
14. Akademi Binası	14. Akademi Binası	2010																																																														
15. Akademi Binası	15. Akademi Binası	2010																																																														
16. Akademi Binası	16. Akademi Binası	2010																																																														
17. Akademi Binası	17. Akademi Binası	2010																																																														
18. Akademi Binası	18. Akademi Binası	2010																																																														
19. Akademi Binası	19. Akademi Binası	2010																																																														
20. Akademi Binası	20. Akademi Binası	2010																																																														
14 : 11	14 : 23	NZEB olan binalar için hayata geçirilmesi planlanan önlemler ve hedeflenen tasarruf seviyeleri genel hatları ile açıklanmıştır. Bu esnada renovasyonu gerçekleştirilecek alanların/cihazların mevcut durumlarına ilişkin bilgiler verilmiş, görseller paylaşılmıştır. Bütün projelerin hayata geçirilmesi neticesinde sağlanması öngörülen tasarruf potansiyeli ve emisyon oranlarındaki azalma nicel veriler halinde sunulmuştur.																																																														
14 : 23	14 : 30	<p>KABEV kapsamında olan diğer binalar için (nZEB hariç) hayata geçirilmesi planlanan önlemler ve hedeflenen tasarruf seviyeleri genel hatları ile açıklanmıştır. Bu esnada renovasyonu gerçekleştirilecek alanların/cihazların mevcut durumlarına ilişkin bilgiler verilmiş, görseller paylaşılmıştır. Bütün projelerin hayata geçirilmesi neticesinde sağlanması öngörülen tasarruf potansiyeli ve emisyon oranlarındaki azalma nicel veriler halinde sunulmuştur.</p> <p>Resim 3 Sunum Dosyası Paylaşılan Bölümler_04</p>  <p>KABEV Kapsamında Bulunan Diğer Binalar (nZEB hariç)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ömer Halisdemir Spor Salonu Kapalı Spor Salonu Spor Bilimleri Fakültesi Teknoloji Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Misafirhane Merkezi Yemekhane Rektörlük Binası Hastane Geçiş Bloğu Uygulama Hastanesi Orkocajı Hastanesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Fakültesi Çamaşırhane Binası İsi Merkezi Binası Gama Kırfe Binası  <p>BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR</p> <p>01</p> <p>Rektörlük ve çamaşırhane binası dış cephe yönetim uygulaması yapılacaktır. Misafirhane binası dış cephe ve çatı ısı yalıtım uygulaması yapılacaktır.</p>  <p>BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR</p> <p>02</p> <p>Havuzun ısıtılması için yağışmalıkazan ilave edilecektir.</p>																																																														

		<p> TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI</p> <p> KABEV</p> <p> THE WORLD BANK Dünya Bankası</p> <p>Ömer Halisdemir Spor Salonu ana havuz ve küçük havuz eşanjörlerine alt kazanlara ilişkin görseller</p>  <p> ATLASGEM® etkinliğine</p>	<p> TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI</p> <p> KABEV</p> <p> THE WORLD BANK Dünya Bankası</p> <p>BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR</p> <p>03</p> <p>Hastane binasında (4 Adet Medikal Hava) kompresörlerin değişik devrili model ile değişimi gerçekleştirilecektir.</p>  <p> ATLASGEM® etkinliğine</p>	<p> TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI</p> <p> KABEV</p> <p> THE WORLD BANK Dünya Bankası</p> <p>BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR</p> <p>04</p> <p>İsı merkez binasında 9 adet sirkülasyon pompası ve kollektör değişimi gerçekleştirilecektir.</p>  <p> ATLASGEM® etkinliğine</p>
		<p> TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI</p> <p> KABEV</p> <p> THE WORLD BANK Dünya Bankası</p> <p>BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR</p> <p>05</p> <p>İsı merkez ve misafirhane binalarında kazan değişimi ve güneş sıcak su kollektörleri ile desteklenmesi sağlanacaktır.</p>  <p> ATLASGEM® etkinliğine</p>	<p> TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI</p> <p> KABEV</p> <p> THE WORLD BANK Dünya Bankası</p> <p>BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR</p> <p>06</p> <p>FCU sirkülasyon pompaları için frekans konvertörü uygulaması yapılacaktır. (Ömer Halis Demir Spor salonu, Kapalı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesi, Rektörlük Binası)</p>  <p> ATLASGEM® etkinliğine</p>	<p> TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI</p> <p> KABEV</p> <p> THE WORLD BANK Dünya Bankası</p> <p>BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR</p> <p>07</p> <p>İsı dağıtım galerisinde ve sıtma teknik hacimlerdeki yalıtımsız boru ve vanaların ısı yalıtımı yapılacaktır.</p>  <p> ATLASGEM® etkinliğine</p>
		<p> TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI</p> <p> KABEV</p> <p> THE WORLD BANK Dünya Bankası</p> <p>BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR</p> <p>08</p> <p>Tesise ait 20 adet hava soğutmalı chillerin, frekans kontrollü hava soğutmalı chiller ile değişimi gerçekleştirilecektir.</p>  <p> ATLASGEM® etkinliğine</p>	<p> TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI</p> <p> KABEV</p> <p> THE WORLD BANK Dünya Bankası</p> <p>BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR</p> <p>09</p> <p>Klima santralleri mevcut EFF2 ve IE2 sınıf motorlarının IE3 verimli motor ile değişimi (230 adet motor değişimi) gerçekleştirilecektir.</p>  <p> ATLASGEM® etkinliğine</p>	<p> TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI</p> <p> KABEV</p> <p> THE WORLD BANK Dünya Bankası</p> <p>BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR</p> <p>10</p> <p>Mevcut armatürlerin LED Armatür (17.175 adet) ile değişimi gerçekleştirilecektir.</p>  <p> ATLASGEM® etkinliğine</p>

<p>14 : 30</p>	<p>14 : 33</p>	<p>Hazırlanan projelerin etkileri çerçevesinde hazırlanan Çevresel sosyal yönetim planı hakkında genel bilgiler verildi. (Neden hazırlandı, kapsam ve kapsam dışında tutulan hususlar, öngörülen etkiler)</p> <p>Resim 4 Sunum Dosyası Paylaşılan Bölümler_05</p>
<p>14 : 33</p>	<p>14 : 35</p>	<p>Oluşturulan çevresel sosyal yönetim planı (ÇSYP) çerçevesinde, atık yönetiminin nasıl sağlanacağı konusu açıklandı. Geçici depolama alanlarının tahsisi konusunda bina yönetiminin, yüklenici firmayı yönlendirmesi gerektiği, şantiye planlarını incelerken, geçici ve tehlikeli atık geçici depolama alanlarının kontrol edilmesi gerektiği</p>

		<p>hatırlatıldı. Özellikle tehlikeli atık geçici depolama alanlarının sızdırmaz özellikte olması gerektiği (toprak temasının engellenmesi) ve tehlikeli atıkların yasal mevzuat şartları gereği maksimum 6 ay sahada depolanabileceği, bu şart dikkate alınarak ve tehlikeli atık miktarları da kontrol edilerek söz konusu atıkların 3 ayda bir yetkili kurumlara tutanak ile teslim edileceği, teslim edilen geri dönüştürülebilir ve tehlikeli atıkların proje sonunda kamu ile paylaşılacağı belirtildi.</p> <p>Resim 5 Sunum Dosyası Paylaşılan Bölümler_06</p>
14 : 35	14 : 37	<p>Gürültü ve tozla mücadele konusunda belirlenen kurallar açıklandı. Özellikle gürültü ile mücadele çerçevesinde belirlenen tedbirler ve iş planlarının; yapım metotları ve beklenen gürültü seviyeleri dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiği, bu konuda yüklenici firmaların, bina yönetimi ve teknik birimler tarafından yönlendirilmesi gerektiği belirtildi.</p> <p>Resim 6 Sunum Dosyası Paylaşılan Bölümler_07</p>
14 : 37	14 : 43	<p>İş sağlığı ve güvenliği planlarına ilişkin genel açıklamalar yapıldı bu çerçevede;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ İSG organizasyon şeması sunuldu. İŞ güvenliğine ilişkin sürecin müteahhit firma tarafından da denetleneceği ve bu konuda valilik İSG birimi ile etkin iletişim sağlanacağı belirtildi. ▪ İSG planları çerçevesinde dikkate alınan hususlar madde madde açıklandı. ▪ Renovasyon çalışmalarının yapılacağı alanlara sadece yetkili bireylerin erişebileceği bu nedenle bina kullanıcılarının bazı dönemlerde erişimlerinin kısıtlanacağına altı çizildi. Çalışma planlarının bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı. ▪ Özellikle EKED sistemi (LOTO) ve kuralları belirtildi.

- İş izin sistemi çerçevesinde değerlendirilecek çalışmalar belirtildi.
- İş izin sistemi açıklandı bu çerçevede özellikle enerji kesintileri ve enerji verilmesi öncesinde bina teknik birimlerinin onayının gerekeceği belirtildi.
- Genel İSG kuralları ve özellikle çevre güvenliği için alınması gereken tedbirlerden bahsedildi.

Resim 7 Sunum Dosyası Paylaşılan Bölümler_08



14 : 43

14 : 47

Paydaş katılımı, öneri ve şikayetlerin alınması değerlendirilmesi ve ilgili tarafların bu süreç hakkında (öneri ve şikayetlere ilişkin alınan kararlar, hayata geçirilen ek önlemler vb.) bilgilendirilmesi hususunda açıklamalar yapıldı.

- Özellikle ATLASCert® tarafından oluşturulan öneri şikâyet dijital formunun kullanımı ve isim ve iletişim bilgisi paylaşılmasa dahi bu form alt yapısı sayesinde, kayıt esnasında oluşturulan ünik kod kullanılarak alınan kararlar hakkında bilgi sahibi olabilecekleri belirtildi. Bu sistem dışında telefon mail vb. yollarla gerçekleştirilen geri bildirimlerde isim ve iletişim bilgisi olmadan süreç hakkında bilgilendirme yapılamayacağı altı çizildi.
- Dijital form, telefon ve mail adresleri belirtildi. Söz konusu bilgilerin hazırlanacak afişler ile bina içinde ve dışında duyurulacağı açıklandı.
- Matbu geri bildirim formları tanıtıldı, bina içinde tesisi edilecek öneri ve şikâyet kutuları ile kontrol periyotları hakkında bilgi verildi.
- Proje kapsamında gerçekleşen, cinsiyet temelli şiddet (taciz, istismar vb.) ve cinsiyet temelli ayrımcılık konularındaki şikayetlerin de şikâyet çözüm mekanizması kapsamında değerlendirileceği açıklandı.

Resim 8 Sunum Dosyası Paylaşılan Bölümler_09



14 : 47

14 : 48

Tadilat öncesi anket katılımı için teşekkür edildi, benzer şekilde tadilat çalışması sonrasında da anketlerin paylaşılacağı, söz konusu anketlere katılım ve hassasiyetle yaklaşım ricasında bulunuldu. Söz konusu anketlerin proje başarısında önem arz ettiği belirtildi.

		KAPANIŞ konuşması yapıldı ve toplantı sonlandırıldı.
--	--	--

Soru ve Cevaplar

Tablo 13 Soru & Cevap Listesi

SORU		CEVAP
01	NZEB kapsamında olmayan 20 adet bina içinde hastane binası var mı? Hastane otoparkı için PV çalışması yapılacak mı? Kaç tane kazanın değişimi yapılacaktır?	Hastane binasının da KABEV kapsamında olduğu, bina yönetimiyle konuşularak ve belli kriterler düşünülerek PV sistemlerinin konumu belirlenmiştir, hastanenin yanında gölge etkisi olduğu için uygun bulunamamıştır. Toplam 3 ve Misafirhanede 1 kazan değişimi olacağı belirtilmiştir.
02	İhale ne zaman yapılacak? Çalışmalara ne zaman başlanacak?	Tarih vermenin mümkün olmadığı söylenmiştir.
03	Havuz ısıtması için 450.000 m ³ civarında doğalgaz tüketimi yapılmaktadır. Bu sebeple havuz derinliğinin düşürülmesi talep edilmişti. Eğer tüketim azaltılırsa ciddi anlamda maddi tasarruf sağlanacaktır, bu konuyla ilgili herhangi bir önlem olacak mı?	Tarifeden dolayı oluşacak farkı gidermek için YÖK ile görüşmek gerektiği, proje için önceliğin enerji verimliliği olduğu belirtilmiştir.
04	Sağlık Yüksekokulu Binası'nda cepheye yakın kısımlarda ısınma sorunu yaşıyor, çatılar akıyor bu binada bir çalışma olacak mı?	Çatıya fotovoltaik panel uygulaması yapılırken zemin iyileştirmesi de yapılacağı söylenmiştir.
05	Hastane için aydınlatma çalışması yapılacak mı?	Aydınlatma armatürlerinin LED dönüşümü yapılacağı söylenmiştir.

Tablo 14 Toplantı Notları & Genel Değerlendirme

- KABEV projesi çerçevesinde hazırlanan broşür ve ek sunum dosyalarının, katılımcıların tamamına cep telefonları veya e-mail adresleri üzerinden iletilecektir.
- Katılımcıların tamamına öneri & şikâyet form linki cep telefonları veya e-mail adresleri üzerinden iletilecektir.

Tablo 15 Toplantı Resimleri

